



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE
Municipio(s): CAÑASGORDAS,

BIP: 4481
Convenio: CN-2024-1255
PEP: 4604121068

Objeto: MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES EN EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS

Matriz de cofinanciación:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	25.423.149	20,3%
CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR EFECTIVO	100.000.000	79,7%
Total	125.423.149	100%

Fechas de interés:

Última aprobación: 2024-11-05

Formalización:

Inicio: 2025-02-12


Terminación: 2025-06-11

Entrega final: Pendiente

Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	49.999.996	39,9%
Ejecutado en especie	0	0,0%
Administración cobrada	0	0,0%
Subtotal ejecutado	49.999.996	39,9%
Deducciones aplicadas	0	0,0%
Subtotal	49.999.996	39,9%
Pendiente por comprometer	75.423.153	60,1%
Total	125.423.149	100%

Avance:

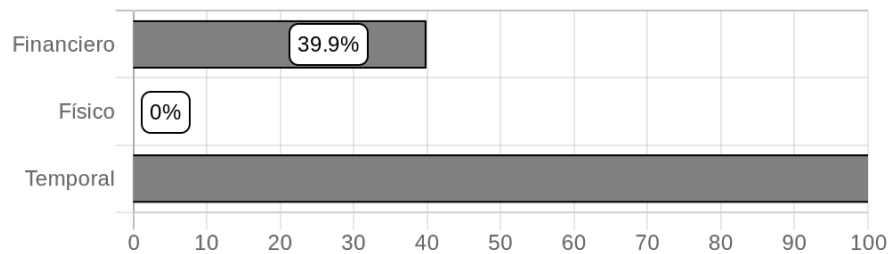

Supervisor(a): ANDRES FELIPE URIBE MONSALVE

Este informe fue actualizado el:



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE
Municipio(s): CAÑASGORDAS,

BIP: 4481

Convenio: CN-2024-1255

PEP: 4604121068

Objeto: MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES EN EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS

Otrosíes:

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2024-1255-01	INGRESO ADIC.VALOR	ESTA ADICIÓN SE HACE NECESARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTRAS DE DRENAJE (FILTRO FRANCES Y CUNETAS) EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN PÍO X, DEBIDO A LA NECESIDAD DE CAPTAR LAS AGUAS DEL TERRENO QUE AFECTABAN LA EJECUCIÓN DEL SALÓN DE CLASES. ADICIONALMENTE LA EJECUCIÓN DEL CERRAMIENTO PROVISIONAL. LAS ACTIVIDADES ANTERIORES NO ESTABAN CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL.	\$9.564.675	\$125.423.149	2025-05-26	2025-06-11

Supervisor(a): ANDRES FELIPE URIBE MONSALVE

Este informe fue actualizado el:
