	<b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b> <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b>  <b>Informe de avance de proyecto</b>	<b>Código:</b> FE-GPA-F-0026 <b>Fecha:</b> 15/02/2024 <b>Versión:</b> 001
--	--	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO  
**Municipio(s):** ANGELOPOLIS,

**BIP:** 4486  
**Convenio:** CN-2024-1277  
**PEP:** 4604121065

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS

**Matriz de cofinanciación:**

**Fechas de interés:**


Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	200.755.847	24,2%
MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS EFECTIVO	230.000.000	27,7%
MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ESPECIE	76.181.343	9,2%
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESPECIE	264.662.480	31,9%
COMUNIDAD EN ESPECIE	58.716.055	7,1%
<b>Total</b>	<b>830.315.725</b>	<b>100%</b>

**Última aprobación:** 2026-05-04  
**Formalización:**  
**Inicio:** 2024-12-12  
**Terminación:** 2026-05-30  
**Entrega final:** 2026-05-30


**Información financiera:**

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	44.750.772	5,4%
<b>Subtotal comprometido</b>	<b>44.750.772</b>	<b>5,4%</b>
Facturado	297.221.652	35,8%
Ejecutado en especie	236.242.800	28,5%
Administración cobrada	34.154.351	4,1%
<b>Subtotal ejecutado</b>	<b>567.618.803</b>	<b>68,4%</b>
Deducciones aplicadas	0	0,0%
<b>Subtotal</b>	<b>567.618.803</b>	<b>68,4%</b>
Pendiente por comprometer	217.946.150	26,2%
<b>Total</b>	<b>830.315.725</b>	<b>100%</b>

**Avance:**

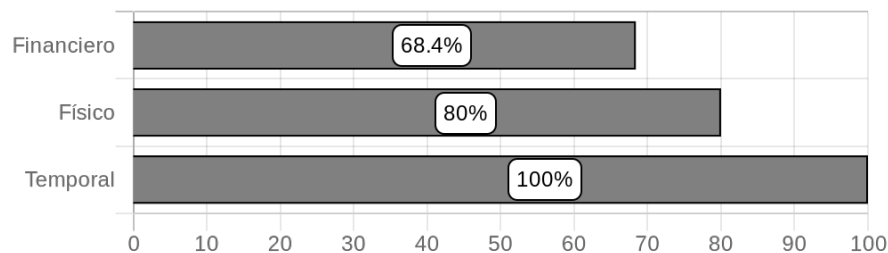

**Supervisor(a):** JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA  
**Este informe fue actualizado el:** 2026-05-14 10:02:02

	<b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b> <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b>  <b>Informe de avance de proyecto</b>	<b>Código:</b> FE-GPA-F-0026 <b>Fecha:</b> 15/02/2024 <b>Versión:</b> 001
--	--	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO  
**Municipio(s):** ANGELOPOLIS,

**BIP:** 4486  
**Convenio:** CN-2024-1277  
**PEP:** 4604121065

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS

**Observaciones:**

**2025-06-09:** A la fecha se cuenta con el envío del siguiente material por parte de la Secretaria de Infraestructura del Departamento (cemento x 50 kg = 900 bultos), con los cuales se tiene programado iniciar la construcción de la placa huella en la vereda San Isidro, la cual tiene con un alcance de 370 metros lineales, estamos a la espera del envío del acero para poder iniciar la construcción.

**2025-07-08:** LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO YA ENVIO TODO EL MATERIAL DE LA PRIMERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 40%, A LA FECHA SE VIENE ADELANTANDO EL CORTE Y FIGURACION DEL ACERO, EL MUNICIPIO SE COMPROMETIO A DAR INICIO A LA CONFORMACION DE LA BANCA, CON EL FIN QUE LA SEGUNDA SEMANA DE JULIO SE INICIE EL VACIADO EN FORMA CON LA OBRA.

**2025-08-14:** LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO YA ENVIO TODO EL MATERIAL DE LA PRIMERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 40%, A LA FECHA SE TERMINO LA CONSTRUCCION DE 150 METROS LINEALES EN LA VEREDA SAN ISIDRO Y SE CONTINUO CON LA EJECUCION DE 220 METROS EN LA VEREDA SAN ISIDRO - LA HERMOSA SECTOR LA ESCUELA.

**2025-10-02:** A LA FECHA SE TERMINO LA CONSTRUCCION DE 150 METROS LINEALES EN LA VEREDA SAN ISIDRO Y 220 METROS EN LA VEREDA SAN ISIDRO - LA HERMOSA SECTOR LA ESCUELA, SE CONTINUARÁ CON LA EJECUCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA CASCAJALA.

**2025-10-20:** A LA FECHA SE TERMINO LA CONSTRUCCION DE 150 METROS LINEALES EN LA VEREDA SAN ISIDRO Y 220 METROS EN LA VEREDA SAN ISIDRO - LA HERMOSA SECTOR LA ESCUELA, SE INICIO LA EJECUCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA CASCAJALA.

**2026-01-28:** EN EL MES DE NOVIEMBRE SE RECIBIO EL MATERIAL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO COMO ES EL CEMENTO Y EL ACERO DE REFUERZO, CON ESTE MATERIAL SE VIENE ADELANTANDO LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA CASCAJALA, SE TIENE CONSTRUIDO 190 METROS LINEALES Y SE CONTINUA CON SU EJECUCION EN EL MES DE DICIEMBRE PARA TERMINAR DICHO TRAMO.


**2026-01-28:** EN EL MES DE DICIEMBRE SE TERMINO LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA CASCAJALA, PARA UN TOTAL DE 240 METROS LINEALES, SE TIENE PROGRAMADO INICIAR EN LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE ENERO DEL 2026 EN LA VEREDA PAJONAL.

**2026-03-02:** EN EL MES DE ENERO SE INICIO CON LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA PAJONAL, EN LA CUAL SE EJECUTARON 20 METROS LINEALES, DE LOS 70 METROS LINEALES QUE SE TIENEN CONTEMPLADOS, SE CONTINUA CON EL FIN DE TERMINAR EN EL MES DE FEBRERO LA TOTALIDAD DEL TRAMO QUE SE TIENE CONTEMPLADO.

**2026-03-31:** EN EL MES DE FEBRERO SE CONTINUO CON LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA PAJONAL, EN LA CUAL SE EJECUTARON 80 METROS LINEALES, ASI TERMINA ESTE TRAMO Y EN EL MES DE MARZO SE TIENE CONTEMPLADO CONTINUAR EN LA VEREDA EL BARRO.

**2026-04-10:** EN EL MES DE MARZO SE INICIO CON LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL BARRO - SECTOR EL TRAPICHE, EN LA CUAL SE EJECUTARON 50 METROS LINEALES, ASI TERMINA ESTE SECTOR Y SE CONTINUA EN

**Supervisor(a):** JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA  
**Este informe fue actualizado el:** 2026-05-14 10:02:02

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b> <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p><b>Informe de avance de proyecto</b></p>	<p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026 <b>Fecha:</b>15/02/2024 <b>Versión:</b>001</p>
--	--	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO  
**Municipio(s):** ANGELOPOLIS,


**BIP:** 4486  
**Convenio:** CN-2024-1277  
**PEP:** 4604121065

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS

EL MES DE ABRIL EN EL OTRO SECTOR QUE CONSTA DE 70 METROS LINEALES..

**2026-05-14:** EN EL MES DE ABRIL SE CONTINUO CON LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL BARRO - SEGUNDO SECTOR, EN EL CUAL SE EJECUTARON 70 METROS LINEALES, ASI TERMINA AMBOS SECTORES PARA UN TOTAL DE 120 METROS LINEALES.

**Supervisor(a):** JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA  
**Este informe fue actualizado el:** 2026-05-14 10:02:02

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b>  <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p><b>Informe de avance de proyecto</b></p>	<p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026  <b>Fecha:</b>15/02/2024  <b>Versión:</b>001</p>
--	---	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO  
**Municipio(s):** ANGELOPOLIS,

**BIP:** 4486  
**Convenio:** CN-2024-1277  
**PEP:** 4604121065

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS

**Otrosíes:**

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2024-1277-01	INGRESO ADIC.TIEMPO	AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	\$0	\$830.315.725	2025-11-04	2026-05-30
CN-2024-1277-02	INGRESO ADIC.TIEMPO	AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	\$0	\$830.315.725	2026-03-04	2026-05-30

**Supervisor(a):** JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA  
**Este informe fue actualizado el:** 2026-05-14 10:02:02



**Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia**

**Informe de avance de proyecto**

**Código:**FE-GPA-F-0026

**Fecha:**15/02/2024

**Versión:**001

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO  
**Municipio(s):** ANGELOPOLIS,

**BIP:** 4486

**Convenio:** CN-2024-1277

**PEP:** 4604121065

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS

**Anexo fotográfico:**



**Supervisor(a):** JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA  
**Este informe fue actualizado el:** 2026-05-14 10:02:02
