



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE
Municipio(s): EL RETIRO,

BIP: 2132
Convenio: CN-2021-0841
PEP: 4604120764

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA VEREDAS LOS MEDIOS Y FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS MEDIOS

Matriz de cofinanciación:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMUNIDAD EN ESPECIE	29.254.299	8,0%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	173.315.810	47,4%
MUNICIPIO DE EL RETIRO EFECTIVO	162.750.000	44,5%
Total	365.320.109	100%

Fechas de interés:

Última aprobación: 2023-02-13

Formalización: 2021-09-23

Inicio: 2021-11-26


Terminación: 2023-05-30

Entrega final: 2023-03-29

Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	230.956.131	63,2%
Ejecutado en especie	29.253.440	8,0%
Administración cobrada	12.975.533	3,6%
Subtotal ejecutado	273.185.104	74,8%
Deducciones aplicadas	0	0,0%
Subtotal	273.185.104	74,8%
Pendiente por comprometer	92.135.005	25,2%
Total	365.320.109	100%

Avance:

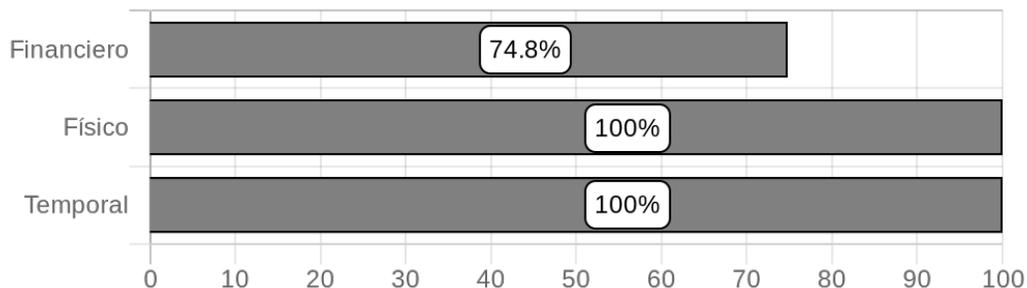

Supervisor(a): JUAN FERNANDO DAVID CARMONA
Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 01:51:12

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE
Municipio(s): EL RETIRO,

BIP: 2132
Convenio: CN-2021-0841
PEP: 4604120764

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA VEREDAS LOS MEDIOS Y FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS MEDIOS

Otrosíes:

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2021-0841-01	INGRESO ADIC.VALOR Y TIEMPO	ESTA ADICIÓN SE HACE NECESARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 150 METROS ADICIONALES DE PLACA HUELLA, PASANDO DE 300 A 400 METROS LINEAL	\$119.065.810	\$246.254.299	2022-10-03	2023-05-30
CN-2021-0841-02	EGRESO ADIC.TIEMPO	ESTA ADICIÓN SE HACE NECESARIA DEBIDO A DIFICULTADES EN LA CONSECUCIÓN Y POSTERIOR CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA (CALIFICADA Y NO CALIFICADA) QUE PERMITA DAR CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2195 DE 2022 ESPECIALMENTE EN LA LÍNEA (COMPONENTE) DE SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE (ACUEDUCTO)	\$0	\$365.320.109	2023-02-14	2023-05-30

Supervisor(a): JUAN FERNANDO DAVID CARMONA
Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 01:51:12



Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE
Municipio(s): EL RETIRO,

BIP: 2132
Convenio: CN-2021-0841
PEP: 4604120764

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA VEREDAS LOS MEDIOS Y FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS MEDIOS

Anexo fotográfico:



Supervisor(a): JUAN FERNANDO DAVID CARMONA
Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 01:51:12
