



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE  
**Municipio(s):** EL RETIRO,

**BIP:** 2132  
**Convenio:** CN-2021-0841  
**PEP:** 4604120764

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA VEREDAS LOS MEDIOS Y FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS MEDIOS

**Matriz de cofinanciación:**

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMUNIDAD EN ESPECIE	29.254.299	8,0%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	173.315.810	47,4%
MUNICIPIO DE EL RETIRO EFECTIVO	162.750.000	44,5%
<b>Total</b>	<b>365.320.109</b>	<b>100%</b>

**Fechas de interés:**

Última aprobación: 2023-02-13

Formalización: 2021-09-23

Inicio: 2021-11-26


Terminación: 2023-05-30

Entrega final: 2023-03-29


**Información financiera:**

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
<b>Subtotal comprometido</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Facturado	230.956.131	63,2%
Ejecutado en especie	29.253.440	8,0%
Administración cobrada	12.975.533	3,6%
<b>Subtotal ejecutado</b>	<b>273.185.104</b>	<b>74,8%</b>
Deducciones aplicadas	0	0,0%
<b>Subtotal</b>	<b>273.185.104</b>	<b>74,8%</b>
Pendiente por comprometer	92.135.005	25,2%
<b>Total</b>	<b>365.320.109</b>	<b>100%</b>

**Avance:**

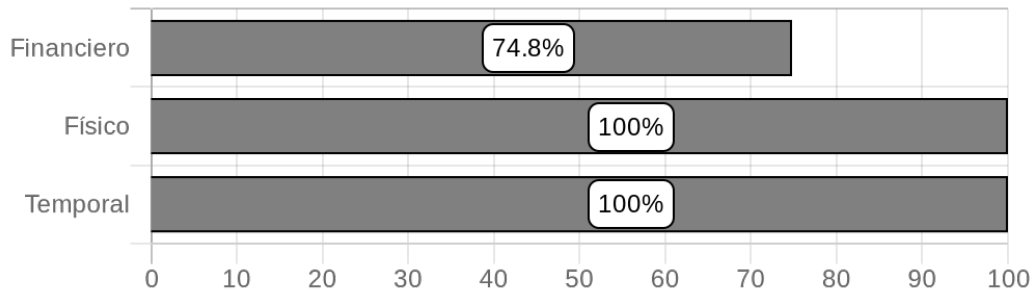

**Supervisor(a):** JUAN FERNANDO DAVID CARMONA  
Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 01:51:12

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b>  <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p><b>Informe de avance de proyecto</b></p>	<p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026  <b>Fecha:</b>15/02/2024  <b>Versión:</b>001</p>
--	---	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE  
**Municipio(s):** EL RETIRO,

**BIP:** 2132  
**Convenio:** CN-2021-0841  
**PEP:** 4604120764

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA VEREDAS LOS MEDIOS Y FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS MEDIOS

**Otrosíes:**

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2021-0841-01	INGRESO ADIC.VALOR Y TIEMPO	ESTA ADICIÓN SE HACE NECESARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 150 METROS ADICIONALES DE PLACA HUELLA, PASANDO DE 300 A 400 METROS LINEAL	\$119.065.810	\$246.254.299	2022-10-03	2023-05-30
CN-2021-0841-02	EGRESO ADIC.TIEMPO	ESTA ADICIÓN SE HACE NECESARIA DEBIDO A DIFICULTADES EN LA CONSECUCIÓN Y POSTERIOR CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA (CALIFICADA Y NO CALIFICADA) QUE PERMITA DAR CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2195 DE 2022 ESPECIALMENTE EN LA LÍNEA (COMPONENTE) DE SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE (ACUEDUCTO)	\$0	\$365.320.109	2023-02-14	2023-05-30

**Supervisor(a):** JUAN FERNANDO DAVID CARMONA  
**Este informe fue actualizado el:** 2024-02-26 01:51:12



**Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia**

**Informe de avance de proyecto**

**Código:**FE-GPA-F-0026

**Fecha:**15/02/2024

**Versión:**001

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE  
**Municipio(s):** EL RETIRO,

**BIP:** 2132  
**Convenio:** CN-2021-0841  
**PEP:** 4604120764

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA VEREDAS LOS MEDIOS Y FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS MEDIOS

**Anexo fotográfico:**



**Supervisor(a):** JUAN FERNANDO DAVID CARMONA  
**Este informe fue actualizado el:** 2024-02-26 01:51:12
