



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE  
**Municipio(s):** CAMPAMENTO,

**BIP:** 3479  
**Convenio:** CN-2023-0534  
**PEP:** 4604120899

**Objeto:** OPTIMIZACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIOS TRAMOS DE VÍA EN LA VEREDA CARACORAL DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO

**Matriz de cofinanciación:**

**Fechas de interés:**


| Cofinanciadores                  | Aporte \$         | %           |
|----------------------------------|-------------------|-------------|
| COMUNIDAD EN EFECTIVO            | 25.376.859        | 30,5%       |
| MUNICIPIO DE CAMPAMENTO EFECTIVO | 44.000.000        | 52,8%       |
| COMUNIDAD EN ESPECIE             | 13.920.000        | 16,7%       |
| <b>Total</b>                     | <b>83.296.859</b> | <b>100%</b> |

**Última aprobación:** 2023-05-15  
**Formalización:** 2023-05-31  
**Inicio:** 2023-08-24  
**Terminación:** 2023-12-31  
**Entrega final:** 2023-12-18


**Información financiera:**

| Descripción                           | Valor \$          | %             |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| Comprometido en solicitudes de pedido | 0                 | 0,0%          |
| Comprometido en pedidos               | 0                 | 0,0%          |
| <b>Subtotal comprometido</b>          | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>   |
| Facturado                             | 65.165.542        | 78,2%         |
| Ejecutado en especie                  | 13.920.000        | 16,7%         |
| Administración cobrada                | 4.665.455         | 5,6%          |
| <b>Subtotal ejecutado</b>             | <b>83.750.997</b> | <b>100,5%</b> |
| Deducciones aplicadas                 | 3.520.000         | 4,2%          |
| <b>Subtotal</b>                       | <b>87.270.997</b> | <b>104,8%</b> |
| Pendiente por comprometer             | -3.974.138        | -4,8%         |
| <b>Total</b>                          | <b>83.296.859</b> | <b>100%</b>   |

**Avance:**

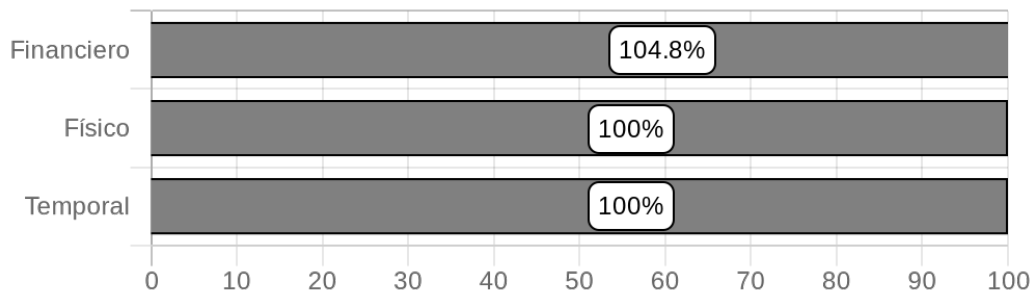

**Supervisor(a):** MARLON LOAIZA YEPES  
Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 12:06:14

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p> | <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia<br/>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p> | <p>Código:FE-GPA-F-0026<br/>Fecha:15/02/2024<br/>Versión:001</p> |
|--|---|--|

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE  
**Municipio(s):** CAMPAMENTO,

**BIP:** 3479  
**Convenio:** CN-2023-0534  
**PEP:** 4604120899


**Objeto:** OPTIMIZACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIOS TRAMOS DE VÍA EN LA VEREDA CARACORAL DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO

**Observaciones:**

**2023-09-22:** El 01 de septiembre se inician las actividades de excavación encontrando un suelo completamente suelto que evidencia un lleno de conformación al momento de la apertura de la vía con una altura promedio de 4 m y una longitud de 13 metros, lleno realizado sobre un macizo rocoso. Se modifica el muro de contención contemplado inicialmente por un muro en tres módulos, la pantalla sobre la margen izquierda apoyada en pilas, la pantalla central y la localizada sobre la margen derecha apoyada sobre un reemplazo en ciclópeo unido al macizo mediante anclajes estructurales.

**2023-09-22:** Se eliminan del presupuesto los entregables, dos cajas de encole y dos estructuras de descole. El proyecto queda con un único entregable correspondiente a un muro de contención con las características geométricas aquí definidas.

**Supervisor(a):** MARLON LOAIZA YEPES  
**Este informe fue actualizado el:** 2024-02-26 12:06:14

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p> | <p><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b><br/> <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p><b>Informe de avance de proyecto</b></p> | <p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026<br/> <b>Fecha:</b>15/02/2024<br/> <b>Versión:</b>001</p> |
|--|---|---|

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE  
**Municipio(s):** CAMPAMENTO,

**BIP:** 3479  
**Convenio:** CN-2023-0534  
**PEP:** 4604120899

**Objeto:** OPTIMIZACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIOS TRAMOS DE VÍA EN LA VEREDA CARACORAL DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO

**Otrosíes:**

| Otrosí          | Tipo de adición    | Objeto   | Valor sin IVA | Último valor sin IVA | Fecha radicación | Vencimiento |
|-----------------|--------------------|--|---------------|----------------------|------------------|-------------|
| CN-2023-0534-01 | INGRESO ADIC.VALOR | ESTA ADICIÓN SE HACE NECESARIA DEBIDO A LOS CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO | \$5.607.308   | \$83.296.859         | 2023-10-05       | 2023-12-31  |

**Supervisor(a):** MARLON LOAIZA YEPES  
**Este informe fue actualizado el:** 2024-02-26 12:06:14
