



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE  
**Municipio(s):** CAMPAMENTO,

**BIP:** 3479  
**Convenio:** CN-2023-0534  
**PEP:** 4604120899

**Objeto:** OPTIMIZACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIOS TRAMOS DE VÍA EN LA VEREDA CARACORAL DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO

**Matriz de cofinanciación:**

**Fechas de interés:**

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	25.376.859	30,5%
MUNICIPIO DE CAMPAMENTO EFECTIVO	44.000.000	52,8%
COMUNIDAD EN ESPECIE	13.920.000	16,7%
<b>Total</b>	<b>83.296.859</b>	<b>100%</b>

**Última aprobación:** 2023-05-15

**Formalización:** 2023-05-31

**Inicio:** 2023-08-24


**Terminación:** 2023-12-31

**Entrega final:** 2023-12-18

**Información financiera:**


Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
<b>Subtotal comprometido</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Facturado	65.165.542	78,2%
Ejecutado en especie	13.920.000	16,7%
Administración cobrada	4.665.455	5,6%
<b>Subtotal ejecutado</b>	<b>83.750.997</b>	<b>100,5%</b>
Deducciones aplicadas	3.520.000	4,2%
<b>Subtotal</b>	<b>87.270.997</b>	<b>104,8%</b>
Pendiente por comprometer	-3.974.138	-4,8%
<b>Total</b>	<b>83.296.859</b>	<b>100%</b>

**Avance:**

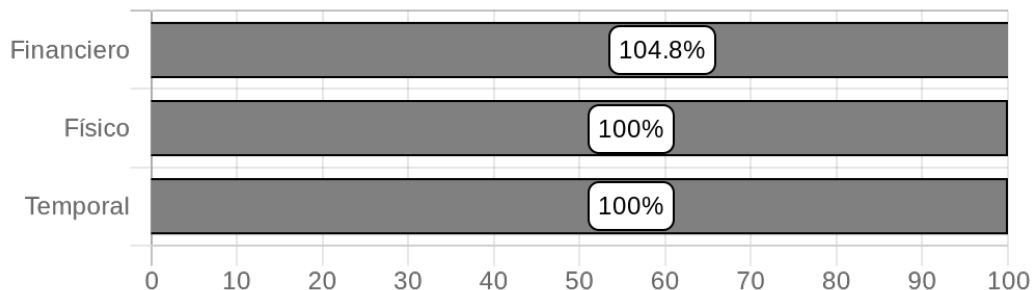

**Supervisor(a):** MARLON LOAIZA YEPES

Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 12:06:14

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	---	--

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE  
**Municipio(s):** CAMPAMENTO,

**BIP:** 3479  
**Convenio:** CN-2023-0534  
**PEP:** 4604120899


**Objeto:** OPTIMIZACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIOS TRAMOS DE VÍA EN LA VEREDA CARACORAL DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO

**Observaciones:**

**2023-09-22:** El 01 de septiembre se inician las actividades de excavación encontrando un suelo completamente suelto que evidencia un lleno de conformación al momento de la apertura de la vía con una altura promedio de 4 m y una longitud de 13 metros, lleno realizado sobre un macizo rocoso. Se modifica el muro de contención contemplado inicialmente por un muro en tres módulos, la pantalla sobre la margen izquierda apoyada en pilas, la pantalla central y la localizada sobre la margen derecha apoyada sobre un reemplazo en ciclópeo unido al macizo mediante anclajes estructurales.

**2023-09-22:** Se eliminan del presupuesto los entregables, dos cajas de encole y dos estructuras de descole. El proyecto queda con un único entregable correspondiente a un muro de contención con las características geométricas aquí definidas.

**Supervisor(a):** MARLON LOAIZA YEPES  
**Este informe fue actualizado el:** 2024-02-26 12:06:14

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b>  <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p><b>Informe de avance de proyecto</b></p>	<p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026  <b>Fecha:</b>15/02/2024  <b>Versión:</b>001</p>
--	---	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE  
**Municipio(s):** CAMPAMENTO,

**BIP:** 3479  
**Convenio:** CN-2023-0534  
**PEP:** 4604120899

**Objeto:** OPTIMIZACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIOS TRAMOS DE VÍA EN LA VEREDA CARACORAL DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO

**Otrosíes:**

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2023-0534-01	INGRESO ADIC.VALOR	ESTA ADICIÓN SE HACE NECESARIA DEBIDO A LOS CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO	\$5.607.308	\$83.296.859	2023-10-05	2023-12-31

**Supervisor(a):** MARLON LOAIZA YEPES  
**Este informe fue actualizado el:** 2024-02-26 12:06:14
