

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO

Municipio(s): CAICEDO,

BIP: 3609

Convenio: CN-2023-0768

PEP: 4604120917

Objeto: MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO.

Matriz de cofinanciación:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	71.422.647	28,0%
MUNICIPIO DE CAICEDO EFECTIVO	20.000.000	7,9%
MUNICIPIO DE CAICEDO ESPECIE	137.447.133	54,0%
COMUNIDAD EN ESPECIE	25.876.029	10,2%
Total	254.745.809	100%


Fechas de interés:

Última aprobación: 2024-11-05
Formalización:
Inicio: 2023-08-22
Terminación: 2025-02-22
Entrega final: Pendiente

Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	53.114.905	20,9%
Ejecutado en especie	94.626.000	37,1%
Administración cobrada	9.462.600	3,7%
Subtotal ejecutado	157.203.505	61,7%
Deducciones aplicadas	2.980.000	1,2%
Subtotal	160.183.505	62,9%
Pendiente por comprometer	94.562.304	37,1%
Total	254.745.809	100%

Avance:

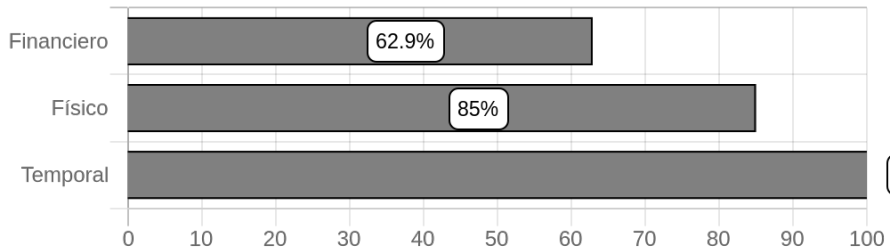

Supervisor(a): JILMER EDIXON SANCHEZ ORTIZ
Este informe fue actualizado el: 2024-11-06 08:52:47

	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia Informe de avance de proyecto	Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO

Municipio(s): CAICEDO,

BIP: 3609

Convenio: CN-2023-0768

PEP: 4604120917

Objeto: MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO.

Observaciones:

- 2023-09-15:** Se realizó socialización con la comunidad y se adelanta proceso de contratación para el suministro de combustible e inspector de obra
- 2023-12-20:** A la fecha se han intervenido 17km sobre el corredor vial La Manga - La Salazar, y sector La Anocozca
- 2024-05-31:** No se han realizado actividades en lo transcurrido del año toda vez que los equipos necesarios para el desarrollo de las actividades (motoniveladora y retroexcavadora), y que son aportados por la administración municipal, no se encontraban en el municipio o requerian reparación. A la fecha ya se cuenta con la disponibilidad de la maquinaria, por lo que se reanudarán las actividades.
- 2024-08-08:** Se reanuda la ejecución de las actividades finalizando la intervención sobre el corredor La Manga - La Salazar e intervenciones en la vereda La Noque.
- 2024-11-06:** Se desarrollan intervenciones en la vereda La Anocozca. Se generan saldos en la ejecución del proyecto por lo que se seleccionan nuevas vías a intervenir.
- 2024-11-15:** Se suspende el convenio debido a condiciones climáticas adversas que afectan el normal desarrollo de las actividades.
- 2025-07-03:** El proyecto se mantiene suspendido debido a daños en la maquinaria del municipio, la cual hace parte integral del aporte en especie comprometido por este.

Supervisor(a): JILMER EDIXON SANCHEZ ORTIZ
Este informe fue actualizado el: 2024-11-06 08:52:47

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO

Municipio(s): CAICEDO,

BIP: 3609

Convenio: CN-2023-0768

PEP: 4604120917

Objeto: MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO.

Otrosíes:

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2023-0768-01	INGRESO ADIC.TIEMPO	ESTE CAMBIO ES NECESARIO DEBIDO A LOS RETRASOS OCASIONADOS POR EL DAÑO Y DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO QUE HACE PARTE DE SUS APORTES EN ESPECIE, ASÍ COMO PARA INTERVENIR UNAS VÍAS ADICIONALES QUE NO ESTABAN CONTEMPLADAS EN EL DIAGNÓSTICO INICIAL.	\$0	\$254.745.810	2024-08-09	
CN-2023-0768-02	INGRESO ADIC.TIEMPO	ESTA ADICIÓN SE HACE NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE SALDOS NO EJECUTADOS PROVENIENTE DE EFICIENCIAS ALCANZADAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y QUE PERMITEN INCREMENTAR, EL ALCANCE DEL CONVENIO A TRAVÉS DE LA INCLUSIÓN DE NUEVAS VEREDAS.	\$0	\$254.745.810	2024-11-06	

Supervisor(a): JILMER EDIXON SANCHEZ ORTIZ

Este informe fue actualizado el: 2024-11-06 08:52:47

	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia Informe de avance de proyecto	Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO
Municipio(s): CAICEDO,

BIP: 3609
Convenio: CN-2023-0768
PEP: 4604120917

Objeto: MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO.

Anexo fotográfico:



Supervisor(a): JILMER EDIXON SANCHEZ ORTIZ
Este informe fue actualizado el: 2024-11-06 08:52:47
