



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE  
CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCAÑO  
**Municipio(s):** DABEIBA, SONSON, VALPARAISO,

**BIP:** 3799

**Convenio:**

EJEC.DIRECTA

**PEP:** 4604120960

**Objeto:** ADECUACIONES LOCATIVAS EN VARIAS I.E.R, DE LOS MUNICIPIOS DE DABEIBA, SONSON Y VALPARAÍSO, EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO.

**Matriz de cofinanciación:**

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	72.187.986	92,7%
COMUNIDAD EN ESPECIE	5.653.531	7,3%
<b>Total</b>	<b>77.841.517</b>	<b>100%</b>

**Fechas de interés:**

**Última aprobación:** 2024-10-15

**Formalización:** NO APLICA

**Inicio:** 2023-10-10


**Terminación:** 2025-12-31

**Entrega final:** Pendiente

**Información financiera:**


Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
<b>Subtotal comprometido</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Facturado	70.140.315	90,1%
Ejecutado en especie	0	0,0%
Administración cobrada	0	0,0%
<b>Subtotal ejecutado</b>	<b>70.140.315</b>	<b>90,1%</b>
Deducciones aplicadas	0	0,0%
<b>Subtotal</b>	<b>70.140.315</b>	<b>90,1%</b>
Pendiente por comprometer	7.701.202	9,9%
<b>Total</b>	<b>77.841.517</b>	<b>100%</b>

**Avance:**

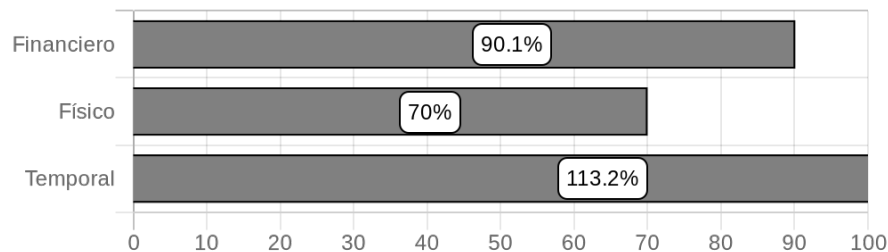

**Supervisor(a):** KAROL DAYAN ORDOÑEZ FRANCO

**Este informe fue actualizado el:** 2025-07-03 09:32:48

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b> <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p><b>Informe de avance de proyecto</b></p>	<p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026 <b>Fecha:</b>15/02/2024 <b>Versión:</b>001</p>
--	--	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE  
CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO  
**Municipio(s):** DABEIBA, SONSON, VALPARAISO,

**BIP:** 3799  
**Convenio:**  
EJEC.DIRECTA  
**PEP:** 4604120960

**Objeto:** ADECUACIONES LOCATIVAS EN VARIAS I.E.R, DE LOS MUNICIPIOS DE DABEIBA, SONSON Y VALPARAISO, EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO.

**Observaciones:**

**2024-12-14:** En el municipio de Sonsón se finalizaron las intervenciones en la institución educativa CER La Loma, las cuales consistieron en el cerramiento de la placa polideportiva en malla eslabonada, remplazo de integrados deportivos de microfútbol y baloncesto, instalación de malla de voleibol, reparación de placa en concreto y pintura de demarcación de escenario deportivo

**2024-12-14:** En el municipio de Dabeiba, CER La Balsita, se finalizaron las actividades de ampliación del comedor escolar, construcción de pérgola e instalación de filtro de potabilización de agua

**2025-07-03:** Se encuentra en ejecución la intervención en la institución educativa del resguardo indígena Marcelino Tascón en el municipio de Valparaiso. Esta consiste en la construcción de la estructura para la cocina escolar, incluye las actividades de fundaciones, losa de contrapiso, sobrecimiento, estructura en mampostería confinada y cubierta. No se había podido iniciar por retrasos del resguardo indígena en conseguir los materiales correspondientes al aporte en especie comprometido por ellos.

**Supervisor(a):** KAROL DAYAN ORDOÑEZ FRANCO  
**Este informe fue actualizado el:** 2025-07-03 09:32:48



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE  
CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO  
**Municipio(s):** DABEIBA, SONSON, VALPARAISO,

**BIP:** 3799

**Convenio:**

EJEC.DIRECTA

**PEP:** 4604120960

**Objeto:** ADECUACIONES LOCATIVAS EN VARIAS I.E.R, DE LOS MUNICIPIOS DE DABEIBA, SONSON Y VALPARAÍSO, EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO.

**Anexo fotográfico:**



**Supervisor(a):** KAROL DAYAN ORDOÑEZ FRANCO  
Este informe fue actualizado el: 2025-07-03 09:32:48
