 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO
Municipio(s): CIUDAD BOLIVAR,

BIP: 4336
Convenio: CN-2024-0983
PEP: 4604121036

Objeto: ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL BOLÍVAR ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR.

Matriz de cofinanciación:

Fechas de interés:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	39.824.245	48,0%
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR EFECTIVO	20.000.000	24,1%
COMUNIDAD EN ESPECIE	6.124.958	7,4%
ASOCIACIÓN USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVEREDAL BOLIVAR ARRIBA EFECTIVO	17.000.000	20,5%
Total	82.949.203	100%

Última aprobación: 2024-09-16
Formalización:
Inicio: 2024-11-14
Terminación: 2026-02-16
Entrega final: 2025-11-14

Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	71.375.118	86,0%
Ejecutado en especie	3.720.000	4,5%
Administración cobrada	2.585.066	3,1%
Subtotal ejecutado	77.680.184	93,6%
Deducciones aplicadas	900.000	1,1%
Subtotal	78.580.184	94,7%
Pendiente por comprometer	4.369.019	5,3%
Total	82.949.203	100%

Avance:

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA
Este informe fue actualizado el: 2025-10-02 01:03:08



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001


Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO
Municipio(s): CIUDAD BOLIVAR,

BIP: 4336

Convenio: CN-2024-0983


PEP: 4604121036

Objeto: ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL BOLÍVAR ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR.

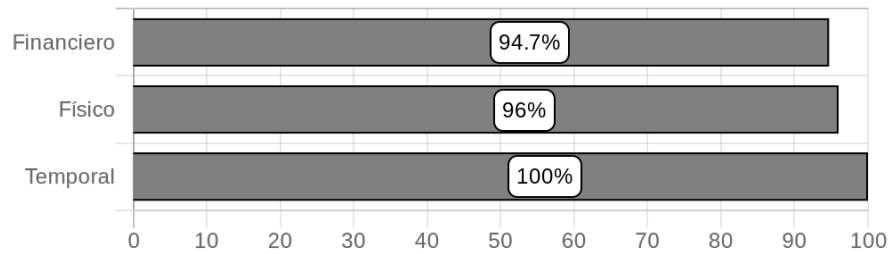

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA

Este informe fue actualizado el: 2025-10-02 01:03:08

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	--	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO
Municipio(s): CIUDAD BOLIVAR,


BIP: 4336
Convenio: CN-2024-0983
PEP: 4604121036

Objeto: ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL BOLÍVAR ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR.

Observaciones:

2025-10-02: A LA FECHA SE TERMINARON TODAS LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL OBJETO DEL CONVENIO COMO SON LA BOCATOMA - LA TUBERIA DE ADUCCION Y LA INSTALACION DEL TANQUE DESAREANADOR.

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA
Este informe fue actualizado el: 2025-10-02 01:03:08

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCIÓN 1 SUROESTE LEJANO
Municipio(s): CIUDAD BOLIVAR,

BIP: 4336
Convenio: CN-2024-0983
PEP: 4604121036

Objeto: ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL BOLÍVAR ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR.

Otrosíes:

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2024-0983-01	INGRESO ADIC. VALOR Y TIEMPO	ESTA MODIFICACIÓN SE HACE NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS ADICIONALES Y EXTRAS, ESTAS ÚLTIMAS NO CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL COMO SON LA IMPERMEABILIZACIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN CONCRETO CON UN ÁREA DE 98 M2, MEDIANTE EL RECUBRIMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO.	\$27.649.734	\$55.299.469	2025-09-24	2026-02-16

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA
Este informe fue actualizado el: 2025-10-02 01:03:08
