


| | | |
|--|--|---|
|  | Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia Informe de avance de proyecto | Código: FE-GPA-F-0026 Fecha: 15/02/2024 Versión: 001 |
|--|--|---|

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO
Municipio(s): CAICEDO,

BIP: 4489
Convenio: CN-2024-1279
PEP: 4604121056

Objeto: AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO

Matriz de cofinanciación:

Fechas de interés:

| Cofinanciadores | Aporte \$ | % |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO | 240.000.000 | 24,6% |
| MUNICIPIO DE CAICEDO EFECTIVO | 276.347.576 | 28,3% |
| MUNICIPIO DE CAICEDO ESPECIE | 95.660.162 | 9,8% |
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESPECIE | 298.300.212 | 30,6% |
| COMUNIDAD EN ESPECIE | 65.566.923 | 6,7% |
| Total | 975.874.873 | 100% |


Última aprobación: 2024-11-12
Formalización:
Inicio: 2024-12-17
Terminación: 2025-11-15

Entrega final: 2025-11-11


Información financiera:

| Descripción | Valor \$ | % |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| Comprometido en solicitudes de pedido | 0 | 0,0% |
| Comprometido en pedidos | 0 | 0,0% |
| Subtotal comprometido | 0 | 0,0% |
| Facturado | 382.876.696 | 39,2% |
| Ejecutado en especie | 421.841.000 | 43,2% |
| Administración cobrada | 56.471.770 | 5,8% |
| Subtotal ejecutado | 861.189.466 | 88,2% |
| Deducciones aplicadas | 0 | 0,0% |
| Subtotal | 861.189.466 | 88,2% |
| Pendiente por comprometer | 114.685.407 | 11,8% |
| Total | 975.874.873 | 100% |

Avance:

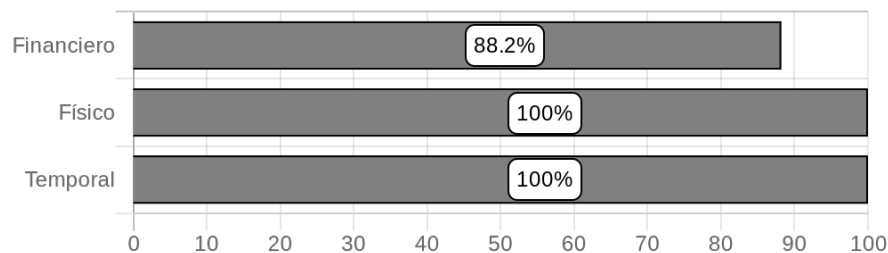

Supervisor(a): JUAN FERNANDO DAVID CARMONA
Este informe fue actualizado el: 2025-11-11 08:25:35

| | | |
|--|--|---|
|  <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p> | <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p> | <p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p> |
|--|--|---|

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO
Municipio(s): CAICEDO,

BIP: 4489
Convenio: CN-2024-1279
PEP: 4604121056

Objeto: AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO

Observaciones:

2025-11-11: Se cuenta con un avance de 150 ml en la Vereda La Salazar de 150 MI es decir el 100% . Se terminala vereda Noque 100ml y la Vereda La Garcia 100ml. en total se construye 1000 m de placa huella

Supervisor(a): JUAN FERNANDO DAVID CARMONA
Este informe fue actualizado el: 2025-11-11 08:25:35



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO
Municipio(s): CAICEDO,

BIP: 4489
Convenio: CN-2024-1279
PEP: 4604121056

Objeto: AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO

Anexo fotográfico:



Supervisor(a): JUAN FERNANDO DAVID CARMONA
Este informe fue actualizado el: 2025-11-11 08:25:35
