	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia Informe de avance de proyecto	Código: FE-GPA-F-0026 Fecha: 15/02/2024 Versión: 001
--	--	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO
Municipio(s): JERICO,

BIP: 4493
Convenio: CN-2024-1283
PEP: 4604121054

Objeto: AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS, EN EL MUNICIPIO DE JERICO

Matriz de cofinanciación:

Fechas de interés:


Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	185.000.000	23,6%
MUNICIPIO DE JERICO EFECTIVO	226.733.278	28,9%
MUNICIPIO DE JERICO ESPECIE	61.486.207	7,8%
COMUNIDAD EN ESPECIE	51.844.783	6,6%
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESPECIE	260.173.776	33,1%
Total	785.238.044	100%

Última aprobación: 2025-10-20
Formalización:
Inicio: 2024-12-18
Terminación: 2026-03-30
Entrega final: 2026-03-30


Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	331.567.455	42,2%
Ejecutado en especie	255.043.000	32,5%
Administración cobrada	36.771.707	4,7%
Subtotal ejecutado	623.382.162	79,4%
Deducciones aplicadas	4.534.666	0,6%
Subtotal	627.916.828	80,0%
Pendiente por comprometer	157.321.216	20,0%
Total	785.238.044	100%

Avance:

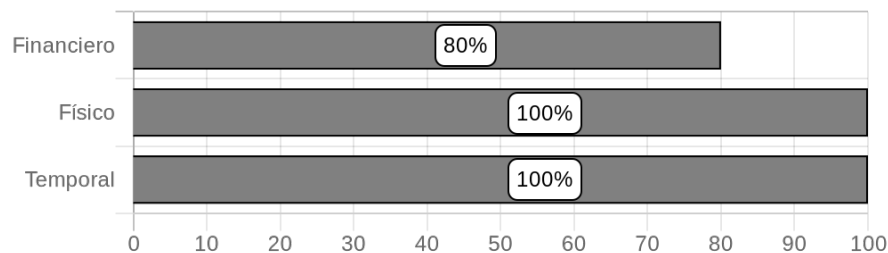

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA
Este informe fue actualizado el: 2026-04-10 12:15:41

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO
Municipio(s): JERICO,

BIP: 4493
Convenio: CN-2024-1283
PEP: 4604121054

Objeto: AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS, EN EL MUNICIPIO DE JERICO

Observaciones:

2025-06-05: Se avanzan actividades en la vereda La Estrella, para la cual se priorizaron 1000 metros de placa huella, a la fecha se cuenta con un avance de 200 metro de placa huella completa y 30 adicionales en rieles y vigas riostra.

2025-07-03: Se cuenta con un avance de 370 metros aproximadamente en la vía de la vereda Estrella Nueva. Se realizó solicitud de segunda entrega de materiales por un 40%, la cual está pendiente por despacho.

2025-08-15: LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO YA ENVIO LA SEGUNDA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 80%, A LA FECHA SE TIENE UN AVANCE DE 600 METROS LINEALES EN LA VEREDA ESTRELLA NUEVA.

2025-10-02: A LA FECHA SE TIENEN TERMINADOS 700 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ESTRELLA NUEVA, SE CONTINÚA TRABAJANDO PARA ALCANZAR LOS 800 METROS Y A LA ESPERA DEL ULTIMO 20% DE ENTREGA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

2025-10-20: A LA FECHA SE TIENEN TERMINADOS 750 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ESTRELLA NUEVA, SE CONTINÚA TRABAJANDO PARA ALCANZAR LOS 800 METROS.

2025-11-10: A LA FECHA SE TIENEN TERMINADOS 800 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ESTRELLA NUEVA, SE CONTINÚA TRABAJANDO PARA ALCANZAR LOS 1.000 METROS QUE ES EL ALCANCE FINAL DEL PROYECTO.

2026-01-28: EN EL MES DE NOVIEMBRE SE ADELANTO LA CONSTRUCCION 870 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ESTRELLA NUEVA, SE CONTINÚA TRABAJANDO PARA ALCANZAR LOS 1.000 METROS QUE ES EL ALCANCE FINAL DEL PROYECTO.


2026-01-28: EN EL MES DE DICIEMBRE SE CONTINUO CON LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA CON UN ACUMULADO DE 890 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA COMPLETOS, 30 METROS LINEALES DE HUELLA Y CENTRO, FALTANDO 30 METROS LINEALES CUNETAS PARA COMPLETAR LOS 920 METROS LINEALES EN LA VEREDA ESTRELLA NUEVA, SE CONTINÚA TRABAJANDO PARA ALCANZAR LOS 1.000 METROS QUE ES EL ALCANCE FINAL DEL PROYECTO.

2026-03-02: EN EL MES DE ENERO SE CONTINUO CON LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA , EN ES ESTE MES SE TERMINAROSN LOS 30 METROS LINEALES DE HUELLA, CENTRO Y CUNETAS QUE ESTABAN PENDIENTES PARA COMPLETAR UN TOTAL DE 920 METROS LINEALES, SE CONTINÚA TRABAJANDO PARA ALCANZAR LOS 1.000 METROS QUE ES EL ALCANCE FINAL DEL PROYECTO.

2026-03-31: EN EL MES DE FEBRERO SE CONTINUO CON LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA , EN ESTE MES SE TERMINO UN TOTAL DE 950 METROS LINEALES, SE CONTINÚA TRABAJANDO PARA ALCANZAR LOS 1.000 METROS QUE ES EL ALCANCE FINAL DEL PROYECTO.

2026-04-10: EN EL MES DE MARZO SE TERMINO LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VERDA LA ESTRELLA , TENIENDO UN ALCANCE FINAL DE 1.000 METROS LINEALES, CON ESTO SE CUMPLE CON EL ALCANCE FINAL DEL PROYECTO.

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA
Este informe fue actualizado el: 2026-04-10 12:15:41

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO
Municipio(s): JERICO,

BIP: 4493
Convenio: CN-2024-1283
PEP: 4604121054

Objeto: AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS, EN EL MUNICIPIO DE JERICO

Otrosíes:

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2024-1283-01	INGRESO ADIC.TIEMPO	AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS, EN EL MUNICIPIO DE JERICO	\$0	\$785.238.044	2025-11-04	2026-03-30

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA
Este informe fue actualizado el: 2026-04-10 12:15:41



**Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia**

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO
Municipio(s): JERICO,

BIP: 4493

Convenio: CN-2024-1283

PEP: 4604121054

Objeto: AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS, EN EL MUNICIPIO DE JERICO

Anexo fotográfico:



Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA
Este informe fue actualizado el: 2026-04-10 12:15:41
