	<b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b> <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b>  <b>Informe de avance de proyecto</b>	<b>Código:</b> FE-GPA-F-0026 <b>Fecha:</b> 15/02/2024 <b>Versión:</b> 001
--	--	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO  
**Municipio(s):** HISPANIA,

**BIP:** 4535  
**Convenio:** CN-2025-0216  
**PEP:** 4604121080

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HISPANIA

**Matriz de cofinanciación:**

**Fechas de interés:**


Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	225.000.000	26,1%
MUNICIPIO DE HISPANIA EFECTIVO	261.875.253	30,4%
MUNICIPIO DE HISPANIA ESPECIE	52.437.702	6,1%
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESPECIE	263.486.480	30,6%
COMUNIDAD EN ESPECIE	59.322.579	6,9%
<b>Total</b>	<b>862.122.014</b>	<b>100%</b>

**Última aprobación:** 2025-10-20  
**Formalización:**  
**Inicio:** 2025-05-30  
**Terminación:** 2026-03-30  
**Entrega final:** 2026-03-30


**Información financiera:**

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	5.652.500	0,7%
<b>Subtotal comprometido</b>	<b>5.652.500</b>	<b>0,7%</b>
Facturado	390.896.133	45,3%
Ejecutado en especie	240.183.200	27,9%
Administración cobrada	34.867.086	4,0%
<b>Subtotal ejecutado</b>	<b>665.946.419</b>	<b>77,2%</b>
Deducciones aplicadas	32.275.253	3,7%
<b>Subtotal</b>	<b>698.221.672</b>	<b>81,0%</b>
Pendiente por comprometer	158.247.842	18,4%
<b>Total</b>	<b>862.122.014</b>	<b>100%</b>

**Avance:**

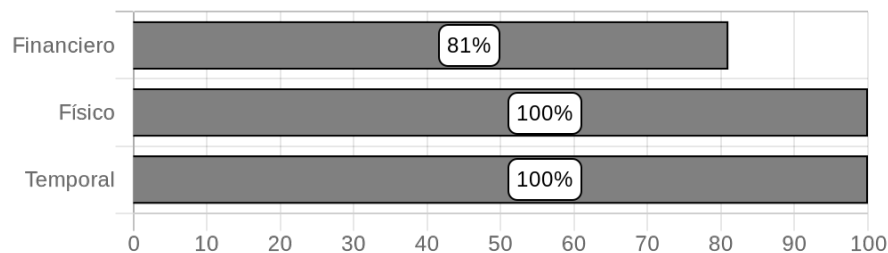

**Supervisor(a):** JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA  
**Este informe fue actualizado el:** 2026-04-10 12:08:49

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p align="center"><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b>  <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p align="center"><b>Informe de avance de proyecto</b></p>	<p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026  <b>Fecha:</b>15/02/2024  <b>Versión:</b>001</p>
--	---	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO  
**Municipio(s):** HISPANIA,

**BIP:** 4535  
**Convenio:** CN-2025-0216  
**PEP:** 4604121080

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HISPANIA

**Observaciones:**

**2025-06-09:** A la fecha se cuenta con el contrato de mano de obra en el área jurídica para iniciar el proceso de firmas y la consecución de las pólizas correspondientes.

**2025-07-08:** A LA FECHA ESTAMOS A LA ESPERA DEL ENVIO DE LA PRIMERA ENTREGA DEL 40% POR PARTE DE LA SECRETRAIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO.

**2025-08-14:** LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO YA ENVIO TODO EL MATERIAL DE LA PRIMERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 40%, A LA FECHA TERMINO 150 METROS LINEALES EN LA VEREDA LA PALMIRA Y SE VIENE ADELANTANDO LA CONSTRUCCION DE 100 METROS LINEALES EN LA VEREDA LA CUELGA.

**2025-10-02:** A LA FECHA SE VIENE ADELANTANDO LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA CUELGA, DE LOS CUALES SE TIENE CONSTRUIDOS 200 METROS Y SE CONTINUA TRABAJANDO PARA ALCANZAR LOS 850 METROS LINEALES.

**2025-10-20:** A LA FECHA SE VIENE ADELANTANDO LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA CUELGA, DE LOS CUALES SE TIENE CONSTRUIDOS 300 METROS Y SE CONTINUA TRABAJANDO PARA ALCANZAR LOS 850 METROS LINEALES.

**2025-11-10:** A LA FECHA SE VIENE ADELANTANDO LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA CUELGA, DE LOS CUALES SE TIENE CONSTRUIDOS 400 METROS Y SE CONTINUA TRABAJANDO PARA ALCANZAR LOS 850 METROS LINEALES.


**2026-01-28:** EN EL MES DE NOVIEMBRE SE ADELANTANDO LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA CUELGA, DE LOS CUALES SE TIENE CONSTRUIDOS 580 METROS Y SE CONTINUA TRABAJANDO PARA ALCANZAR LOS 850 METROS LINEALES.

**2026-01-30:** EN EL MES DE DICIEMBRE SE ADELANTANDO LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA CUELGA, DE LOS CUALES SE TIENE CONSTRUIDOS 665 METROS Y SE CONTINUA TRABAJANDO PARA ALCANZAR LOS 850 METROS LINEALES.

**2026-03-02:** EN EL MES DE ENERO SE ADELANTANDO EL TRANSPORTE DEL MATERIAL DE PLAYA DESDE EL CENTRO DE ACOPIO HASTA EL SITIO DE CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA CUELGA, SE TIENE PROGRAMADO EL REINICIO EN EL MES DE FEBRERO CON EL FIN DE CONCLUIR LOS 850 METROS LINEALES EN ESTE TRAMO DE VIA.

**2026-03-31:** EN EL MES DE FEBRERO SE CONTINUO CON LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA CUELGA, SE CONSTRUYERON 85 METROS LINEALES, SE TIENE PROGRAMADO PARA EL MES DE MARZO CONCLUIR LOS 850 METROS LINEALES EN ESTE TRAMO DE VIA.

**Supervisor(a):** JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA  
**Este informe fue actualizado el:** 2026-04-10 12:08:49

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b> <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p><b>Informe de avance de proyecto</b></p>	<p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026 <b>Fecha:</b>15/02/2024 <b>Versión:</b>001</p>
--	--	---


**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO  
**Municipio(s):** HISPANIA,

**BIP:** 4535  
**Convenio:** CN-2025-0216  
**PEP:** 4604121080

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HISPANIA

**2026-04-10:** EN EL MES DE MARZO SE TERMINO LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA CUELGA, EN ESTA VEREDA SE CONSTRUYERON UN TOTAL DE 850 METROS LINEALES, CON ESTE TRAMO SE CUMPLE CON EL ALCANCE FINAL DEL PROYECTO, PARA UN TOTAL DE 1.000 METROS LINEALES, REPRESENTADOS EN (150 METROS EN LA VEREDA LA PALMIRA Y 850 METROS EN LA VEREDA LA CUELGA)

**Supervisor(a):** JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA  
**Este informe fue actualizado el:** 2026-04-10 12:08:49

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b>  <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p><b>Informe de avance de proyecto</b></p>	<p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026  <b>Fecha:</b>15/02/2024  <b>Versión:</b>001</p>
--	---	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO  
**Municipio(s):** HISPANIA,

**BIP:** 4535  
**Convenio:** CN-2025-0216  
**PEP:** 4604121080

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HISPANIA

**Otrosíes:**

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2025-0216-01	INGRESO ADIC.TIEMPO	AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HISPANIA	\$0	\$862.122.014	2025-11-04	2026-03-30

**Supervisor(a):** JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA  
**Este informe fue actualizado el:** 2026-04-10 12:08:49



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO  
**Municipio(s):** HISPANIA,

**BIP:** 4535

**Convenio:** CN-2025-0216

**PEP:** 4604121080

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HISPANIA

**Anexo fotográfico:**



**Supervisor(a):** JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA

**Este informe fue actualizado el:** 2026-04-10 12:08:49
