



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE
Municipio(s): CAÑASGORDAS,

BIP: 4726
Convenio: CN-2024-1486
PEP: 4604121069

Objeto: MEJORAMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA CAMPIÑA, EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORSA

Matriz de cofinanciación:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	18.164.759	16,5%
CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR EFECTIVO	92.000.000	83,5%
Total	110.164.759	100%

Fechas de interés:

Última aprobación: 2024-12-09

Formalización:

Inicio: 2025-02-12


Terminación: 2025-05-11

Entrega final: Pendiente

Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	46.000.000	41,8%
Ejecutado en especie	0	0,0%
Administración cobrada	0	0,0%
Subtotal ejecutado	46.000.000	41,8%
Deducciones aplicadas	0	0,0%
Subtotal	46.000.000	41,8%
Pendiente por comprometer	64.164.759	58,2%
Total	110.164.759	100%

Avance:

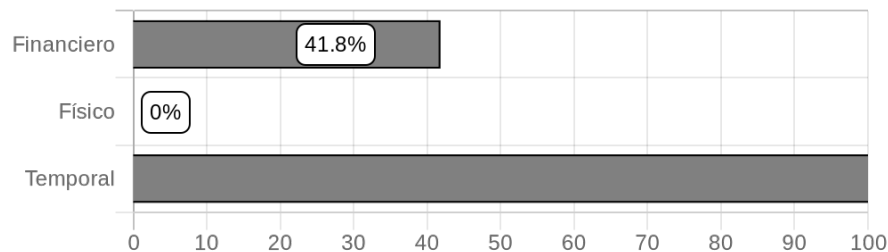

Supervisor(a): ANDRES FELIPE URIBE MONSALVE

Este informe fue actualizado el:
