



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO
Municipio(s): CARAMANTA,

BIP: 5253

Convenio: CN-2025-1188

PEP: 4604121154

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA FINCA CAFETERA A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE POSCOSECHA Y MANEJO DE ARVENSES, MUNICIPIO DE CARAMANTA.

Matriz de cofinanciación:

Fechas de interés:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	27.091.101	31,9%
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA EFECTIVO	20.000.000	23,6%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	34.972.750	41,2%
COMUNIDAD EN ESPECIE	2.750.000	3,2%
Total	84.813.851	100%

Última aprobación: 2025-10-06

Formalización:

Inicio: 2025-11-24


Terminación: 2026-11-23

Entrega final: Pendiente

Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	65.933.394	77,7%
Ejecutado en especie	0	0,0%
Administración cobrada	0	0,0%
Subtotal ejecutado	65.933.394	77,7%
Deducciones aplicadas	0	0,0%
Subtotal	65.933.394	77,7%
Pendiente por comprometer	18.880.457	22,3%
Total	84.813.851	100%

Avance:

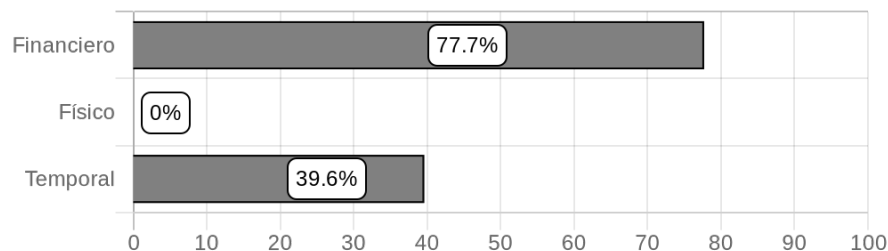

Supervisor(a): DEICY CATALINA GUERRA GARCIA

Este informe fue actualizado el:
