



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE
Municipio(s): CAICEDO, SANTA FE DE ANTIOQUIA,

BIP: 2238

Convenio: CN-2021-1017

PEP: 4604120765

Objeto: PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA PENA QUE CONDUCE A LA VÍA LA GARCÍA – LA MILAGROSA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CAICEDO Y SANTA FE DE ANTIOQUIA.

Matriz de cofinanciación:

Fechas de interés:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
MUNICIPIO DE CAICEDO EFECTIVO	20.000.000	7,8%
MUNICIPIO DE CAICEDO ESPECIE	20.000.000	7,8%
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA EFECTIVO	70.000.000	27,2%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	147.786.760	57,3%
Total	257.786.760	100%

Última aprobación: 2022-08-16

Formalización: 2021-09-01

Inicio: 2022-08-12


Terminación: 2023-04-14

Entrega final: 2023-07-04

Información financiera:


Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	203.088.788	78,8%
Ejecutado en especie	20.000.000	7,8%
Administración cobrada	12.436.426	4,8%
Subtotal ejecutado	235.525.214	91,4%
Deducciones aplicadas	13.810.000	5,4%
Subtotal	249.335.214	96,7%
Pendiente por comprometer	8.451.546	3,3%
Total	257.786.760	100%

Avance:

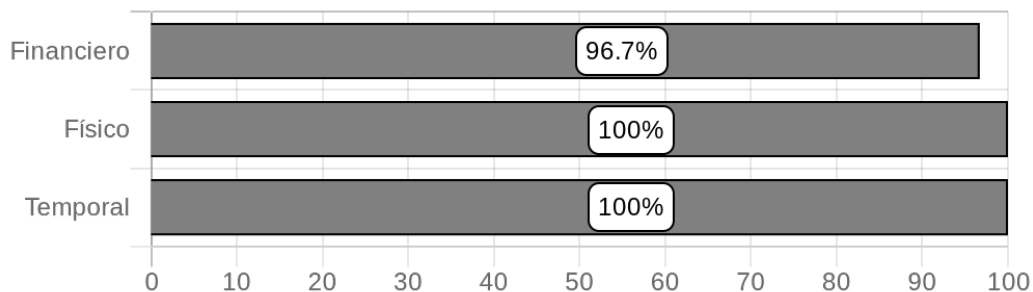

Supervisor(a): MARLON LOAIZA YEPES

Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 11:37:39

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	---	--

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE
Municipio(s): CAICEDO, SANTA FE DE ANTIOQUIA,


BIP: 2238
Convenio: CN-2021-1017
PEP: 4604120765

Objeto: PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA PENA QUE CONDUCE A LA VÍA LA GARCÍA – LA MILAGROSA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CAICEDO Y SANTA FE DE ANTIOQUIA.

Observaciones:

2024-02-26: Terminado y entregado

Supervisor(a): MARLON LOAIZA YEPES
Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 11:37:39

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE
Municipio(s): CAICEDO, SANTA FE DE ANTIOQUIA,

BIP: 2238
Convenio: CN-2021-1017
PEP: 4604120765

Objeto: PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA PENA QUE CONDUCE A LA VÍA LA GARCÍA – LA MILAGROSA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CAICEDO Y SANTA FE DE ANTIOQUIA.

Otrosíes:

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2021-1017-01	INGRESO ADIC.VALOR Y TIEMPO	ESTA MODIFICACIÓN SE HACE NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2195 DEL 18 DE ENERO DEL 2022 PARA LA EJCUCIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE MANERA DIRECTA POR PARTE DEL COMITÉ DE CAFETEROS, REALIZANDO LA CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA A TRAVES DE EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES.	\$47.786.760	\$210.000.000	2022-08-22	2023-04-14

Supervisor(a): MARLON LOAIZA YEPES
Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 11:37:39



Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE
Municipio(s): CAICEDO, SANTA FE DE ANTIOQUIA,

BIP: 2238
Convenio: CN-2021-1017
PEP: 4604120765

Objeto: PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA PENA QUE CONDUCE A LA VÍA LA GARCÍA – LA MILAGROSA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CAICEDO Y SANTA FE DE ANTIOQUIA.

Anexo fotográfico:



Supervisor(a): MARLON LOAIZA YEPES

Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 11:37:39
