



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO
Municipio(s): JARDIN,

BIP: 2520
Convenio: CN-2021-1640
PEP: 4604120819

Objeto: CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE JARDIN, PARA LA COFINANCIACIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL.

Matriz de cofinanciación:

Fechas de interés:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
MUNICIPIO DE JARDIN EFECTIVO	183.136.608	33,3%
EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA EFECTIVO	121.090.847	22,0%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	189.052.099	34,3%
COMUNIDAD EN ESPECIE	57.252.448	10,4%
Total	550.532.002	100%

Última aprobación: 2023-05-02

Formalización: 2021-11-13

Inicio: 2022-01-20


Terminación: 2023-08-20

Entrega final: 2023-08-20

Información financiera:


Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	428.485.092	77,8%
Ejecutado en especie	56.966.300	10,3%
Administración cobrada	41.720.437	7,6%
Subtotal ejecutado	527.171.829	95,8%
Deducciones aplicadas	20.935.245	3,8%
Subtotal	548.107.074	99,6%
Pendiente por comprometer	2.424.928	0,4%
Total	550.532.002	100%

Avance:

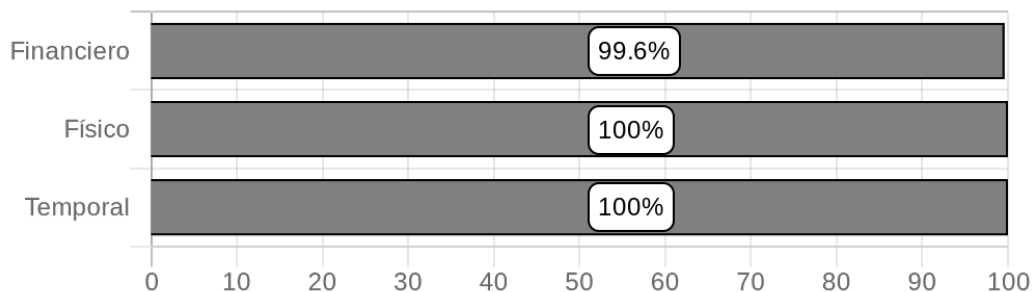

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA

Este informe fue actualizado el: 2024-02-27 07:15:54

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	---	--

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO
Municipio(s): JARDIN,


BIP: 2520
Convenio: CN-2021-1640
PEP: 4604120819

Objeto: CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE JARDIN, PARA LA COFINANCIACIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL.

Observaciones:

2024-02-27: El proyecto de vivienda nueva rural dispersa en varias veredas del municipio de Jardín, tuvo un alcance final de 15 viviendas construidas, las cuales fueron entregadas a la comunidad y los diferentes cofinanciadores, se encuentra en proceso de liquidación por parte de la Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA.

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA
Este informe fue actualizado el: 2024-02-27 07:15:54

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p align="center">Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p align="center">Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO
Municipio(s): JARDIN,


BIP: 2520
Convenio: CN-2021-1640
PEP: 4604120819

Objeto: CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE JARDIN, PARA LA COFINANCIACIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL.

Otrosíes:

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2021-1640-01	INGRESO ADIC.TIEMPO	DEBIDO A LAS DIFICULTADES QUE TUVO EL COMITÉ DE CAFETEROS AL INICIO DEL AÑO 2022, DONDE DEBIÓ REALIZAR AJUSTES ADMINISTRATIVOS BAJO LA LEY 2195 DEL 18 DE ENERO DE 2022, POR MEDIO DE LA CUAL "SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" QUE LLEVARON A LOS CONVENIOS A TENER UN RETRASO APROXIMADO DE TRES MESES EN EL CRONOGRAMA DEFINIDO, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBIDO A LAS DIFICULTADES PARA LA SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.	\$0	\$542.083.529	2022-12-13	2023-08-20
CN-2021-1640-02	INGRESO ADIC.VALOR Y TIEMPO	ESTA ADICIÓN SE HACE NECESARIA, PARA AJUSTAR LOS SALDOS NO EJECUTADOS DEL PRESUPUESTO EN UN 13,34% EQUIVALENTE AL IPC – ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, APROBADO POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS ADICIONALES Y EXTRAS, ESTAS ÚLTIMAS NO CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL.	\$8.448.473	\$542.083.529	2023-05-04	2023-08-20

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA
Este informe fue actualizado el: 2024-02-27 07:15:54

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	--	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO
Municipio(s): JARDIN,

BIP: 2520
Convenio: CN-2021-1640
PEP: 4604120819

Objeto: CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE JARDIN, PARA LA COFINANCIACIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL.

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA
Este informe fue actualizado el: 2024-02-27 07:15:54



**Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia**

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO
Municipio(s): JARDIN,

BIP: 2520
Convenio: CN-2021-1640
PEP: 4604120819

Objeto: CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE JARDIN, PARA LA COFINANCIACIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL.

Anexo fotográfico:



Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA
Este informe fue actualizado el: 2024-02-27 07:15:54
