 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b>  <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p><b>Informe de avance de proyecto</b></p>	<p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026  <b>Fecha:</b>15/02/2024  <b>Versión:</b>001</p>
--	---	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO  
**Municipio(s):** ANDES,

**BIP:** 2507  
**Convenio:** CN-2021-1631  
**PEP:** 4604120792

**Objeto:** CONSTRUCCIÓN DE BENEFICIADERO PARA EL GRUPO RENACER SANTA RITA – ASORENACER EN EL MUNICIPIO DE ANDES

**Matriz de cofinanciación:**

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	49.824.597	53,4%
GRUPO ASOCIATIVO RENACER EFECTIVO	43.475.055	46,6%
<b>Total</b>	<b>93.299.652</b>	<b>100%</b>


**Fechas de interés:**

**Última aprobación:** 2023-02-06  
**Formalización:** 2021-11-24  
**Inicio:** 2022-01-24  
**Terminación:** 2023-06-29  
**Entrega final:** 2024-02-27

**Información financiera:**


Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
<b>Subtotal comprometido</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Facturado	89.321.901	95,7%
Ejecutado en especie	0	0,0%
Administración cobrada	3.950.092	4,2%
<b>Subtotal ejecutado</b>	<b>93.271.993</b>	<b>100,0%</b>
Deducciones aplicadas	0	0,0%
<b>Subtotal</b>	<b>93.271.993</b>	<b>100,0%</b>
Pendiente por comprometer	27.659	0,0%
<b>Total</b>	<b>93.299.652</b>	<b>100%</b>

**Avance:**

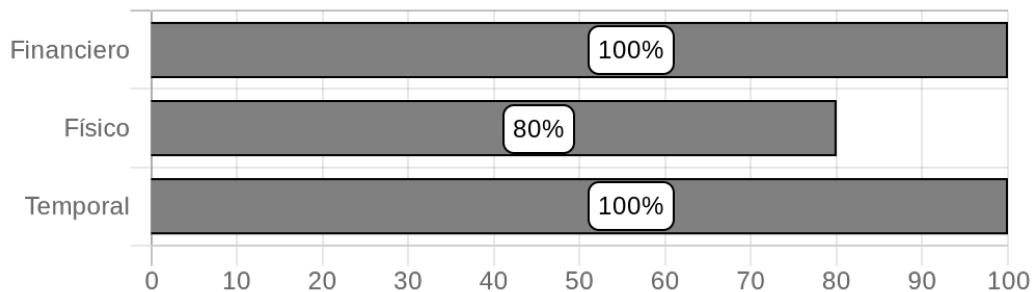

**Supervisor(a):** NICOLAS AUGUSTO COLORADO RESTREPO

**Este informe fue actualizado el:** 2024-02-27 11:29:47

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b> <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p><b>Informe de avance de proyecto</b></p>	<p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026 <b>Fecha:</b>15/02/2024 <b>Versión:</b>001</p>
--	--	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO  
**Municipio(s):** ANDES,


**BIP:** 2507  
**Convenio:** CN-2021-1631  
**PEP:** 4604120792

**Objeto:** CONSTRUCCIÓN DE BENEFICIADERO PARA EL GRUPO RENACER SANTA RITA – ASORENACER EN EL MUNICIPIO DE ANDES

**Observaciones:**

**2024-02-27:** Obra de infraestructura beneficiadero y compostera terminados, equipos ecomil y tolva instalados, en proceso adecuación final obra de infraestructura.

**Supervisor(a):** NICOLAS AUGUSTO COLORADO RESTREPO  
**Este informe fue actualizado el:** 2024-02-27 11:29:47

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p align="center"><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b>  <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p align="center"><b>Informe de avance de proyecto</b></p>	<p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026  <b>Fecha:</b>15/02/2024  <b>Versión:</b>001</p>
--	---	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO  
**Municipio(s):** ANDES,

**BIP:** 2507  
**Convenio:** CN-2021-1631  
**PEP:** 4604120792

**Objeto:** CONSTRUCCIÓN DE BENEFICIADERO PARA EL GRUPO RENACER SANTA RITA – ASORENACER EN EL MUNICIPIO DE ANDES

**Otrosíes:**

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2021-1631-01	EGRESO ADIC.VALOR	ESTA MODIFICACIÓN SE REQUIERE PARA ASUMIR EL MAYOR COSTO DE LOS EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	\$9.438.983	\$78.571.487	2022-07-26	2023-06-29
CN-2021-1631-02	INGRESO ADIC.TIEMPO	ESTA ADICIÓN SE HACE NECESARIA PARA DEFINIR LOS APORTES PARA LA ADECUACIÓN FINAL DE LA OBRA CIVIL, ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y ACUEDUCTO EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL BENEFICIADERO GRUPO ASORENACER.	\$0	\$88.010.470	2022-12-20	2023-06-29
CN-2021-1631-03	INGRESO ADIC.VALOR	ESTA MODIFICACIÓN SE HACE NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REQUERIDAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS, LAS CUALES NO ESTABAN CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL DEL PROYECTO.	\$5.289.182	\$88.010.470	2023-02-13	2023-06-29

**Supervisor(a):** NICOLAS AUGUSTO COLORADO RESTREPO

**Este informe fue actualizado el:** 2024-02-27 11:29:47
