



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE  
Municipio(s): ARGELIA,

BIP: 2641  
Convenio: CN-2022-0043  
PEP: 4604120813

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAIMARAL, EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA

Matriz de cofinanciación:

| Cofinanciadores               | Aporte \$          | %           |
|-------------------------------|--------------------|-------------|
| COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO  | 103.982.468        | 29,7%       |
| MUNICIPIO DE ARGELIA ESPECIE  | 211.147.352        | 60,4%       |
| MUNICIPIO DE ARGELIA EFECTIVO | 25.585.000         | 7,3%        |
| COMUNIDAD EN ESPECIE          | 8.882.454          | 2,5%        |
| <b>Total</b>                  | <b>349.597.274</b> | <b>100%</b> |

Fechas de interés:

Última aprobación: 2022-05-02

Formalización: 2022-01-27

Inicio: 2022-01-27


Terminación: 2023-05-30

Entrega final: 2023-05-04

Información financiera:

| Descripción                           | Valor \$           | %            |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| Comprometido en solicitudes de pedido | 0                  | 0,0%         |
| Comprometido en pedidos               | 0                  | 0,0%         |
| <b>Subtotal comprometido</b>          | <b>0</b>           | <b>0,0%</b>  |
| Facturado                             | 57.937.813         | 16,6%        |
| Ejecutado en especie                  | 217.956.000        | 62,3%        |
| Administración cobrada                | 21.795.600         | 6,2%         |
| <b>Subtotal ejecutado</b>             | <b>297.689.413</b> | <b>85,2%</b> |
| Deducciones aplicadas                 | 3.581.900          | 1,0%         |
| <b>Subtotal</b>                       | <b>301.271.313</b> | <b>86,2%</b> |
| Pendiente por comprometer             | 48.325.961         | 13,8%        |
| <b>Total</b>                          | <b>349.597.274</b> | <b>100%</b>  |

Avance:

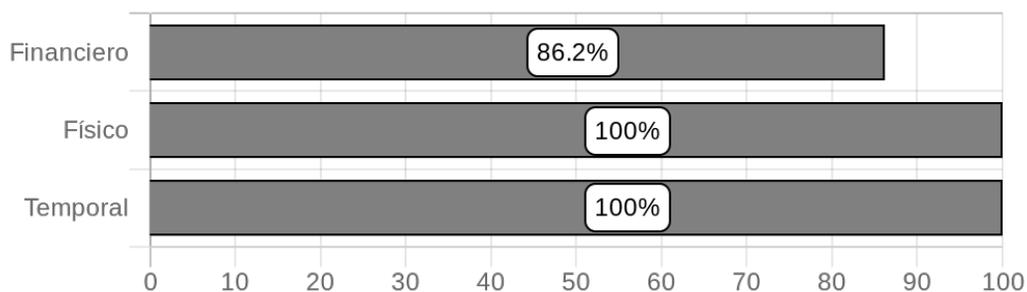

Supervisor(a): JUAN FERNANDO DAVID CARMONA

Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 01:28:53

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p> | <p><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b><br/><b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p><b>Informe de avance de proyecto</b></p> | <p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026<br/><b>Fecha:</b>15/02/2024<br/><b>Versión:</b>001</p> |
|--|--|---|

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE  
**Municipio(s):** ARGELIA,

**BIP:** 2641  
**Convenio:** CN-2022-0043  
**PEP:** 4604120813

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAIMARAL, EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA

**Observaciones:**

**2024-02-26:** Liquidado y entregado a la comunidad

**Supervisor(a):** JUAN FERNANDO DAVID CARMONA  
**Este informe fue actualizado el:** 2024-02-26 01:28:53

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p> | <p><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b><br/> <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p><b>Informe de avance de proyecto</b></p> | <p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026<br/> <b>Fecha:</b>15/02/2024<br/> <b>Versión:</b>001</p> |
|--|---|---|

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE  
**Municipio(s):** ARGELIA,

**BIP:** 2641  
**Convenio:** CN-2022-0043  
**PEP:** 4604120813

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAIMARAL, EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA

**Otrosíes:**

| Otrosí          | Tipo de adición    | Objeto   | Valor sin IVA | Último valor sin IVA | Fecha radicación | Vencimiento |
|-----------------|--------------------|--|---------------|----------------------|------------------|-------------|
| CN-2022-0043-01 | INGRESO ADIC.VALOR | ESTA MODIFICACIÓN SE HACE NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2195 DEL 18 DE ENERO DE 2022, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE MANERA DIRECTA POR PARTE DEL COMITÉ DE CAFETEROS | \$27.379.783  | \$322.217.491        | 2022-05-04       | 2023-05-30  |

**Supervisor(a):** JUAN FERNANDO DAVID CARMONA  
**Este informe fue actualizado el:** 2024-02-26 01:28:53



**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE  
**Municipio(s):** ARGELIA,

**BIP:** 2641  
**Convenio:** CN-2022-0043  
**PEP:** 4604120813

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAIMARAL, EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA

**Anexo fotográfico:**



**Supervisor(a):** JUAN FERNANDO DAVID CARMONA  
**Este informe fue actualizado el:** 2024-02-26 01:28:53
