	<b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b> <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b>  <b>Informe de avance de proyecto</b>	<b>Código:</b> FE-GPA-F-0026 <b>Fecha:</b> 15/02/2024 <b>Versión:</b> 001
--	--	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE  
**Municipio(s):** ABEJORRAL,

**BIP:** 2835  
**Convenio:** CN-2022-0831  
**PEP:** 4604120835

**Objeto:** SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE ABEJOPRRAL

**Matriz de cofinanciación:**

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	69.282.237	34,7%
MUNICIPIO DE ABEJORRAL EFECTIVO	67.200.000	33,7%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	55.000.000	27,6%
COMUNIDAD EN ESPECIE	8.060.606	4,0%
<b>Total</b>	<b>199.542.843</b>	<b>100%</b>


**Fechas de interés:**

**Última aprobación:** 2022-07-11  
**Formalización:** 2022-07-29  
**Inicio:** 2022-09-26  
**Terminación:** 2023-09-26  
**Entrega final:** 2023-09-02


**Información financiera:**

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
<b>Subtotal comprometido</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Facturado	171.841.715	86,1%
Ejecutado en especie	8.058.200	4,0%
Administración cobrada	11.028.507	5,5%
<b>Subtotal ejecutado</b>	<b>190.928.422</b>	<b>95,7%</b>
Deducciones aplicadas	7.056.000	3,5%
<b>Subtotal</b>	<b>197.984.422</b>	<b>99,2%</b>
Pendiente por comprometer	1.558.421	0,8%
<b>Total</b>	<b>199.542.843</b>	<b>100%</b>

**Avance:**

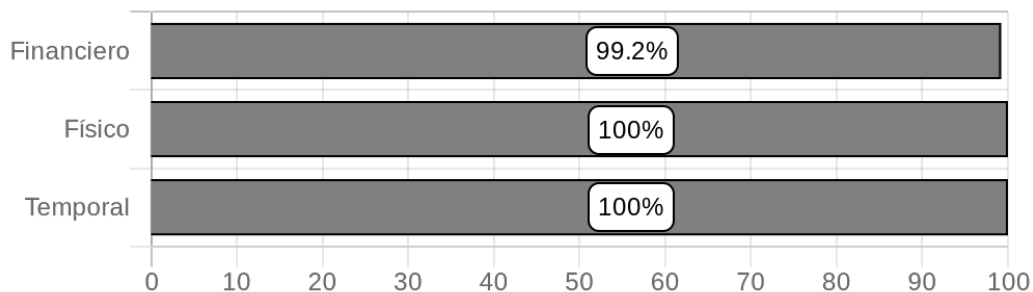

**Supervisor(a):** LEON JAIRO GARZON MUÑOZ  
**Este informe fue actualizado el:** 2024-03-01 11:08:25

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b> <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p><b>Informe de avance de proyecto</b></p>	<p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026 <b>Fecha:</b>15/02/2024 <b>Versión:</b>001</p>
--	--	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE  
**Municipio(s):** ABEJORRAL,

**BIP:** 2835  
**Convenio:** CN-2022-0831  
**PEP:** 4604120835

**Objeto:** SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE ABEJOPRRAL

**Observaciones:**

**2024-02-26:** Se efectuó la entrega de 20 marquesinas y 509.716 árboles fertilizados. (dado el menor costo del bulto de fertilizantes)

**Supervisor(a):** LEON JAIRO GARZON MUÑOZ  
**Este informe fue actualizado el:** 2024-03-01 11:08:25



**Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia**

**Informe de avance de proyecto**

**Código:**FE-GPA-F-0026

**Fecha:**15/02/2024

**Versión:**001

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE  
**Municipio(s):** ABEJORRAL,

**BIP:** 2835  
**Convenio:** CN-2022-0831  
**PEP:** 4604120835

**Objeto:** SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE ABEJOPRRAL

**Anexo fotográfico:**



**Supervisor(a):** LEON JAIRO GARZON MUÑOZ  
**Este informe fue actualizado el:** 2024-03-01 11:08:25
