



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO  
Municipio(s): HELICONIA,

BIP: 3065

Convenio:

EJEC.DIRECTA

PEP: 4604120854

Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias a través de la construcción de placa huella en la vereda la Pradera Sector Tamargal en el municipio de Heliconia

Matriz de cofinanciación:

Fechas de interés:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	20.115.982	58,1%
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRADERA EFECTIVO	8.312.519	24,0%
COMUNIDAD EN ESPECIE	6.209.936	17,9%
<b>Total</b>	<b>34.638.437</b>	<b>100%</b>

Última aprobación: 2023-08-08

Formalización: NO APLICA

Inicio: 2022-10-18


Terminación: 2023-12-18

Entrega final: Pendiente

Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
<b>Subtotal comprometido</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Facturado	26.348.054	76,1%
Ejecutado en especie	6.164.000	17,8%
Administración cobrada	1.886.429	5,4%
<b>Subtotal ejecutado</b>	<b>34.398.483</b>	<b>99,3%</b>
Deducciones aplicadas	0	0,0%
<b>Subtotal</b>	<b>34.398.483</b>	<b>99,3%</b>
Pendiente por comprometer	239.954	0,7%
<b>Total</b>	<b>34.638.437</b>	<b>100%</b>

Avance:

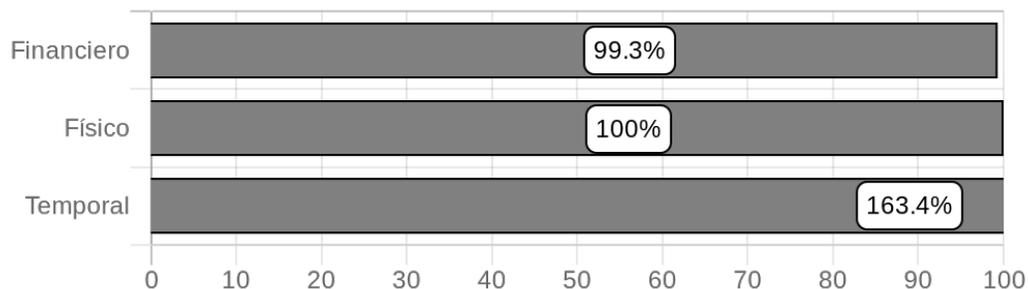

Supervisor(a): SEBASTIAN BEDOYA ARANGO  
Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 01:20:27

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b> <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p><b>Informe de avance de proyecto</b></p>	<p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026 <b>Fecha:</b>15/02/2024 <b>Versión:</b>001</p>
--	--	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO  
**Municipio(s):** HELICONIA,

**BIP:** 3065  
**Convenio:**  
EJEC.DIRECTA  
**PEP:** 4604120854

**Objeto:** MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias a través de la construcción de placa huella en la vereda La Pradera Sector Tamargal en el municipio de Heliconia

**Observaciones:**

**2023-11-03:** Pendiente entrega de materiales faltantes

**2023-12-19:** Se entregaron los materiales faltantes y se finalizó la construcción de la placa huella

**Supervisor(a):** SEBASTIAN BEDOYA ARANGO  
**Este informe fue actualizado el:** 2024-02-26 01:20:27



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO  
**Municipio(s):** HELICONIA,

**BIP:** 3065

**Convenio:**

EJEC.DIRECTA

**PEP:** 4604120854

**Objeto:** MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias a través de la construcción de placa huella en la vereda La Pradera Sector Tamargal en el municipio de Heliconia

**Anexo fotográfico:**



**Supervisor(a):** SEBASTIAN BEDOYA ARANGO  
Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 01:20:27
