



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE  
**Municipio(s):** BURITICA,

**BIP:** 3467  
**Convenio:** CN-2023-0531  
**PEP:** 4604120901

**Objeto:** PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO SECO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE BURITICA

**Matriz de cofinanciación:**

Cofinanciadores	Aporte \$	%
MUNICIPIO DE BURITICA EFECTIVO	50.000.000	40,3%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	44.090.667	35,5%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	24.000.000	19,3%
COMUNIDAD EN ESPECIE	6.112.000	4,9%
<b>Total</b>	<b>124.202.667</b>	<b>100%</b>

**Fechas de interés:**

**Última aprobación:** 2023-05-15

**Formalización:** 2023-06-06

**Inicio:** 2023-06-27


**Terminación:** 2024-02-10

**Entrega final:** 2023-10-06


**Información financiera:**

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
<b>Subtotal comprometido</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Facturado	100.687.202	81,1%
Ejecutado en especie	6.112.000	4,9%
Administración cobrada	6.318.304	5,1%
<b>Subtotal ejecutado</b>	<b>113.117.506</b>	<b>91,1%</b>
Deducciones aplicadas	0	0,0%
<b>Subtotal</b>	<b>113.117.506</b>	<b>91,1%</b>
Pendiente por comprometer	11.085.161	8,9%
<b>Total</b>	<b>124.202.667</b>	<b>100%</b>

**Avance:**

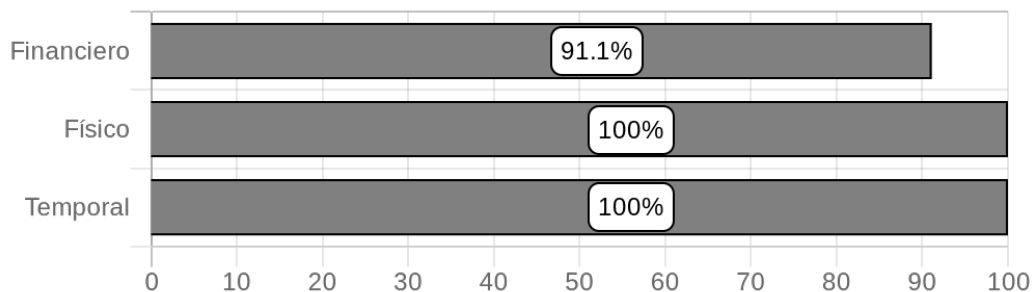

**Supervisor(a):** LEON JAIRO GARZON MUÑOZ  
**Este informe fue actualizado el:** 2024-03-01 11:09:09

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b> <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p><b>Informe de avance de proyecto</b></p>	<p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026 <b>Fecha:</b>15/02/2024 <b>Versión:</b>001</p>
--	--	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE  
**Municipio(s):** BURITICA,

**BIP:** 3467  
**Convenio:** CN-2023-0531  
**PEP:** 4604120901

**Objeto:** PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO SECO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE BURITICA

**Observaciones:**

**2024-02-10:** Se efectuó la entrega de 24 marquesinas, adicionalmente se entregan 24 Kit para la calidad del café.

**Supervisor(a):** LEON JAIRO GARZON MUÑOZ  
**Este informe fue actualizado el:** 2024-03-01 11:09:09



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE  
**Municipio(s):** BURITICA,

**BIP:** 3467  
**Convenio:** CN-2023-0531  
**PEP:** 4604120901

**Objeto:** PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO SECO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE BURITICA

**Anexo fotográfico:**



**Supervisor(a):** LEON JAIRO GARZON MUÑOZ  
Este informe fue actualizado el: 2024-03-01 11:09:09
