 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO
Municipio(s): CARAMANTA,

BIP: 3526
Convenio: CN-2023-0614
PEP: 4604120953

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN EL SECTOR PALMICHAL, EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA

Matriz de cofinanciación:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	229.226.051	30,5%
MUNICIPIO DE CARAMANTA ESPECIE	368.728.736	49,0%
COMUNIDAD EN ESPECIE	24.783.373	3,3%
MUNICIPIO DE CARAMANTA EFECTIVO	130.000.000	17,3%
Total	752.738.160	100%


Fechas de interés:

Última aprobación: 2023-05-15
Formalización: 2023-06-14
Inicio: 2023-10-13
Terminación: 2024-05-12
Entrega final: Pendiente


Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	0	0,0%
Ejecutado en especie	0	0,0%
Administración cobrada	0	0,0%
Subtotal ejecutado	0	0,0%
Deducciones aplicadas	0	0,0%
Subtotal	0	0,0%
Pendiente por comprometer	752.738.160	100,0%
Total	752.738.160	100%

Avance:

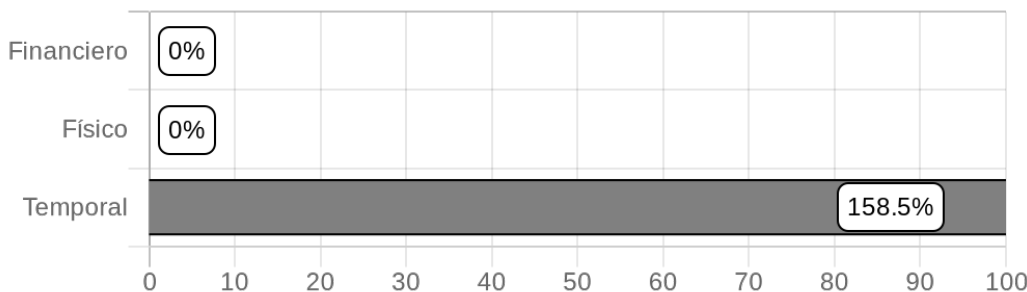

Supervisor(a): SEBASTIAN BEDOYA ARANGO
Este informe fue actualizado el: 2024-01-31 03:34:26

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	---	--

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO
Municipio(s): CARAMANTA,

BIP: 3526
Convenio: CN-2023-0614
PEP: 4604120953


Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN EL SECTOR PALMICHAL, EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA

Observaciones:

2023-11-03: Pendiente desembolso de aportes comprometidos por el cofinanciador

2024-01-31: No se ejecutó el objeto del convenio toda vez que el municipio no realizó el desembolso de los aportes comprometidos dentro del plazo definido en el convenio.

Supervisor(a): SEBASTIAN BEDOYA ARANGO
Este informe fue actualizado el: 2024-01-31 03:34:26

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO
Municipio(s): CARAMANTA,

BIP: 3526
Convenio: CN-2023-0614
PEP: 4604120953

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN EL SECTOR PALMICHAL, EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA

Otrosíes:

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2023-0614-01	EGRESO ADIC.VALOR	ESTA MODIFICACIÓN OBEDECE A LA SOLICITUD REALIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS RECURSOS DISPONIBLES PROVENIENTES POR EL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN DISMINUYERON, POR LO TANTO, SE COMPROMETE A REALIZAR LA OBRA CON UN MENOR ALCANCE PASANDO DE 1,6 KMS DE PLACA HUELLA A 0,6 KMS DE PLACA DE HUELLA.	\$752.738.160	\$2.012.012.951	2023-08-16	2024-05-12

Supervisor(a): SEBASTIAN BEDOYA ARANGO
Este informe fue actualizado el: 2024-01-31 03:34:26
