



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO
Municipio(s): CARAMANTA,

BIP: 4747

Convenio: CN-2025-0071

PEP: 4604121081

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA Y LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA

Matriz de cofinanciación:

Fechas de interés:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	14.649.122	44,0%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	8.200.000	24,6%
COMUNIDAD EN ESPECIE	2.464.300	7,4%
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL ALTO OCCIDENTE DE CALDAS EFECTIVO	8.000.000	24,0%
Total	33.313.422	100%

Última aprobación: 2025-04-01

Formalización:

Inicio: 2025-02-07


Terminación: 2025-12-06

Entrega final: 2026-03-03

Información financiera:


Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	27.869.808	83,7%
Ejecutado en especie	2.164.300	6,5%
Administración cobrada	1.747.919	5,2%
Subtotal ejecutado	31.782.027	95,4%
Deducciones aplicadas	0	0,0%
Subtotal	31.782.027	95,4%
Pendiente por comprometer	1.531.395	4,6%
Total	33.313.422	100%

Avance:

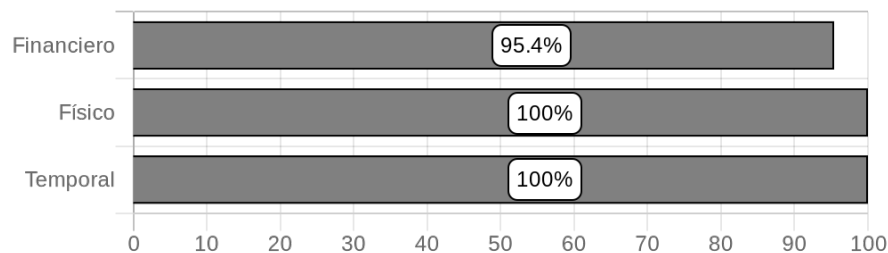

Supervisor(a): NICOLAS AUGUSTO COLORADO RESTREPO

Este informe fue actualizado el: 2026-03-03 07:54:10

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	--	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO
Municipio(s): CARAMANTA,


BIP: 4747
Convenio: CN-2025-0071
PEP: 4604121081

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA Y LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA

Observaciones:

2026-03-03: Se entregó y construyó 3 marquesinas, instalación de 2 módulos tipo ecoplus de 4@. Adicional 2 fumigadoras y una motosierra. Un motor 1/2 caballo y bultos de fertilizante y 8 de cal.

Supervisor(a): NICOLAS AUGUSTO COLORADO RESTREPO
Este informe fue actualizado el: 2026-03-03 07:54:10

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p align="center">Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p align="center">Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO
Municipio(s): CARAMANTA,

BIP: 4747
Convenio: CN-2025-0071
PEP: 4604121081

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA Y LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA

Otrosíes:

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2025-0071-01	INGRESO ADIC.VALOR	POR SOLICITUD DIRECTA DE LA COMUNIDAD CAFETERA SE MODIFICA EL ALCANCE Y LOS COMPONENTES DEL PROYECTO, LO QUE AFECTA DE MANERA DIRECTA EL PRESUPUESTO Y LA MATRIZ DE COFINANCIACIÓN.	\$136.343	\$33.177.079	2025-05-06	2025-12-06
CN-2025-0071-02	EGRESO ADIC.TIEMPO	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA Y LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$0	\$33.313.422	2025-07-25	2025-12-06

Supervisor(a): NICOLAS AUGUSTO COLORADO RESTREPO
Este informe fue actualizado el: 2026-03-03 07:54:10



**Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia**

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO
Municipio(s): CARAMANTA,

BIP: 4747

Convenio: CN-2025-0071

PEP: 4604121081

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA Y LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA

Anexo fotográfico:



Supervisor(a): NICOLAS AUGUSTO COLORADO RESTREPO

Este informe fue actualizado el: 2026-03-03 07:54:10
