Federación Nacional de Cafeteros de Colombia	**Federación Nacional de Cafeteros de Colombia** **Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia** **Informe de avance de proyecto**	**Código:**FE-GPA-F-0026 **Fecha:**15/02/2024 **Versión:**001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE
Municipio(s): ANORI,

BIP: 2867
Convenio: CN-2022-0927
PEP: 4604120844

Objeto: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BENEFICIO DEL CAFÉ Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS EFICIENTES, EN EL MUNICIPIO DE ANORI

Matriz de cofinanciación:

Cofinanciadores	Aporte $	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	61.063.673	35,8%
MUNICIPIO DE ANORI EFECTIVO	90.000.000	52,7%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	5.000.000	2,9%
COMUNIDAD EN ESPECIE	14.681.199	8,6%
Total	**170.744.872**	**100%**

Fechas de interés:

Última aprobación: 2022-08-01
Formalización: 2022-08-24
Inicio: 2023-03-01
Terminación: 2024-03-01

Entrega final: 2024-02-26

Información financiera:

Descripción	Valor $	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	**0**	**0,0%**
Facturado	118.896.753	69,6%
Ejecutado en especie	14.681.200	8,6%
Administración cobrada	8.110.592	4,8%
Subtotal ejecutado	**141.688.545**	**83,0%**
Deducciones aplicadas	12.150.000	7,1%
Subtotal	**153.838.545**	**90,1%**
Pendiente por comprometer	16.906.327	9,9%
Total	**170.744.872**	**100%**

Avance:

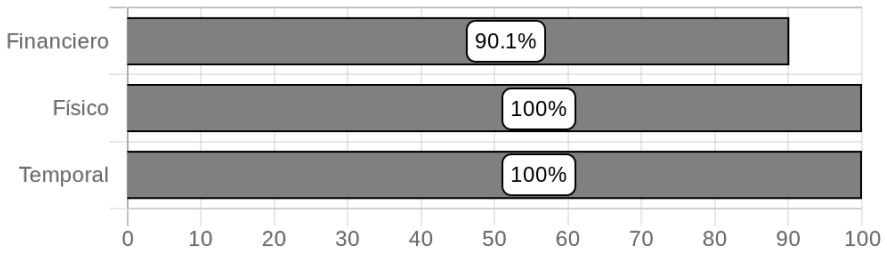

Supervisor(a): MARLON LOAIZA YEPES
Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 11:53:12

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE
Municipio(s): ANORI,

BIP: 2867
Convenio: CN-2022-0927
PEP: 4604120844

Objeto: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BENEFICIO DEL CAFÉ Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS EFICIENTES, EN EL MUNICIPIO DE ANORI

Observaciones:

2024-02-26: Terminado y entregado

Supervisor(a): MARLON LOAIZA YEPES
Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 11:53:12
