Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE
Municipio(s): CAÑASGORDAS,

BIP: 3166
Convenio: CN-2022-1659
PEP: 4604120875

Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS

Matriz de cofinanciación:

Cofinanciadores	Aporte $	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	57.093.680	33,4%
MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS EFECTIVO	16.374.252	9,6%
MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS ESPECIE	65.452.973	38,3%
COMUNIDAD EN ESPECIE	31.794.164	18,6%
Total	**170.715.069**	**100%**

Fechas de interés:

Última aprobación: 2024-07-02
Formalización: 2022-12-23
Inicio: 2023-05-16
Terminación: 2024-09-21

Entrega final: Pendiente

Información financiera:

Descripción	Valor $	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	**0**	**0,0%**
Facturado	60.759.702	35,6%
Ejecutado en especie	97.247.040	57,0%
Administración cobrada	10.091.310	5,9%
Subtotal ejecutado	**168.098.052**	**98,5%**
Deducciones aplicadas	28.743	0,0%
Subtotal	**168.126.795**	**98,5%**
Pendiente por comprometer	2.588.274	1,5%
Total	**170.715.069**	**100%**

Avance:

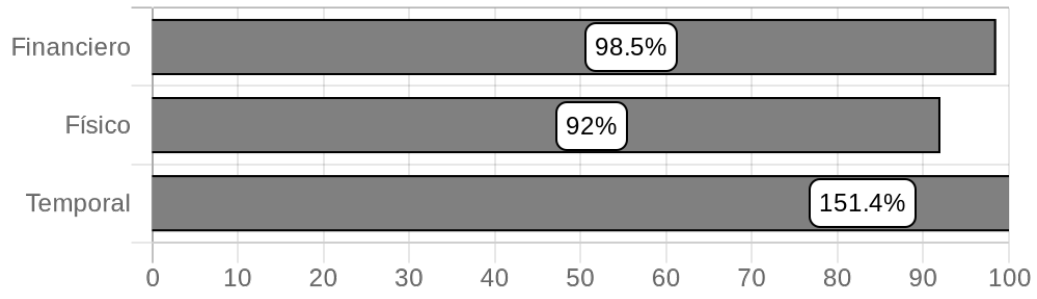

Supervisor(a): ANDRES FELIPE URIBE MONSALVE
Este informe fue actualizado el: 2024-07-11 06:48:49

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE
Municipio(s): CAÑASGORDAS,

BIP: 3166
Convenio: CN-2022-1659
PEP: 4604120875

Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS

Observaciones:

2024-04-25: El municipio tiene la siguiente disponibilidad de maquinaria para atender las actividades del convenio: una niveladora, un vibro compactador, una retroexcavadora y dos volquetas sencillas.

2024-04-25: Con corte a abril de 2024 se han ejecutado intervenciones en 35,8 km en las siguientes vías: Alto a Buenavista (5 km), Rubicón a San Pascual (13,8 km), La Curva a La Soledad (5 km), El Socorro a La Manga (9 km), El Socorro a La Malena (3 km).

2024-04-25: La red terciaria del municipio de Cañasgordas esta compuesta por 160 km de vías, de los cuales con el presupuesto que se tiene disponible al 03/05/2024, se tiene proyectado intervenir 42 km de vías en las siguientes partes: La Balsa a Moroto (9 km), Imantago a San Luis del Café (8 km), San Luis a Caracoral (5 km), San Luis a Llano Grande (7 km), San Luis a El Retiro (7 km), San Luis a Bellavista (6 km).

2023-05-16: Se firmo el acta de inicio del contrato el 16/05/2023 entre el Municipio y el Comité Departamental.

2024-04-26: El 26/04/2024 se decide realizar el acta de suspensión No. 1 del contrato, debido a que en el mes de abril no se lograron ejecutar intervenciones en las vías porque el proveedor tuvo problemas para suministrar combustible. Se decide esperar a que se solucione este problema.

2024-05-02: El 02/05/2024 se formalizó el acta de reinicio del contrato al tener certeza por parte del proveedor que ya había superado los inconvenientes de suministro y tiene la capacidad para entregar combustible.

2024-05-04: El 04/05/2024 se realizo la reunión del mes de Mayo del Comité Municipal de Cafeteros de Cañasgordas en las oficinas de la Federación de este municipio. A este encuentro asistieron miembros del Comité Municipal de Cafeteros, funcionarios del actual gobierno municipal incluyendo el alcalde, los extensionistas de la zona y el gestor de este proyecto de infraestructura. En el encuentro se entregó un balance de las intervenciones realizadas y los lugares atendidos hasta la fecha con los recursos del convenio CN-2022-1659, en donde se destaca el buen manejo del combustible que se ha efectuado en conjunto entre los encargados de la maquinaria amarilla del municipio y el miembro del Comité Municipal de Cafeteros que apoya el control del suministro de ACPM. Adicionalmente, se hizo un reconocimiento de la buena gestión realizada en el mejoramiento de las vías en los meses de verano, puesto que ahora que se está pasando por una temporada invernal, las vías han tenido un buen comportamiento y en su gran mayoría se mantienen en buenas condiciones. Los asistentes a la reunión manifiestan su satisfacción con el proyecto y consideran importante seguir impulsando este tipo de convenios.

2024-05-06: El 06/05/2024 se solicitó al Comité Departamental de Cafeteros la ampliación del plazo del convenio CN-2022-1659 debido a que se perdieron días de ejecución por las dificultades en la entrega del combustible por parte del proveedor y también por el bajo rendimiento en las actividades a causa del invierno que inicio en abril y que a la fecha ha aumentado. En el acta No. 12 fue aprobada la ampliación del plazo hasta el 21/07/2024. Es importante precisar que se solicitaron dos (2) meses después de un acuerdo entre alcaldía municipal de Cañasgordas, miembros del Comité Municipal de Cafeteros y el gestor del proyecto.

2024-05-18: Después de realizar el proceso administrativo correspondiente, se legaliza la ampliación del convenio hasta el 21/07/2024.

2024-05-21: Se ejecutan actividades de mantenimiento en la vía de la vereda el Canelito utilizando la siguiente maquinaria: Motoniveladora, excavadora, retroexcavadora, volqueta, rodillo compactador.

2024-05-23: Se evidenciaron varias inconsistencias con los soportes de las remisiones entregados para cobro por parte del proveedor Manco Diaz Henderson, motivo por el cual se solicitó por parte del gestor del proyecto al funcionario Héctor Alirio jefe de maquinaria del

Supervisor(a): ANDRES FELIPE URIBE MONSALVE
Este informe fue actualizado el: 2024-07-11 06:48:49

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE
Municipio(s): CAÑASGORDAS,

BIP: 3166
Convenio: CN-2022-1659
PEP: 4604120875

Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS

municipio y al señor Mauricio Higuita miembro del Comité Municipal de Cafeteros, una buena revisión de los soportes de despacho de combustible, para que de esta forma se logre tener una relación adecuada de la información de lo que realmente se ha consumido en la ejecución de los trabajos. Por lo tanto, hasta no tener claridad no se pagará y por lo pronto se rechazo la factura FEV2-23.

2024-06-10: El proveedor Manco Diaz Henderson comparte nuevamente un archivo con información en la que se relaciono el cobro del combustible adeudado dentro del convenio a esta empresa.

2024-06-14: Con la intención de aclarar muchos temas del convenio, el 14 de junio de 2024 se realizo un comité técnico en las oficinas de la secretaria de planeación del municipio de Cañasgordas. En este encuentro participaron el arquitecto José Iván Quiroz Higuita (Secretario de planeación), el funcionario Héctor Alirio Goez Higuita (jefe de maquinaria Amarilla del Municipio de Cañasgordas y el ingeniero Andrés Felipe Uribe Monsalve (gestor del proyecto). Los objetivos de la reunión fueron revisar el avance de ejecución del proyecto, aclarar por medio de la revisión de soportes los despachos de combustibles que realmente realizo el proveedor Manco Diaz Henderson, y conciliar una modificación al proyecto en la que se considero adicionar cuantía y tiempo al proyecto. De esta reunión se ejecuto la respectiva acta.

2024-06-14: Después de los hallazgos evidenciados en la revisión de los soportes entregados por el proveedor Manco Diaz Henderson, en donde habían inconsistencias, se toma la decisión entre el Municipio y el gestor de proyectos, de cambiar el proveedor de combustible. Por lo tanto, se consolidan los recibos validos para pago, de tal forma que se le pagaran estos consumos y se terminara la relación comercial.

2024-11-02: El 02/07/2024 se solicitó al Comité Departamental de Cafeteros la modificación del convenio CN-2022-1659, en donde se planteó la adición de cuantía y plazo debido a que se otorgará mas recursos para el mantenimiento de las vías del corregimiento de San Pascual, por ende se necesita más tiempo para la intervención. En el acta No. 18 fue aprobada la ampliación del plazo hasta el 21/09/2024 y un cambio en la matriz de cofinanciación en donde cada aportante proporcionara lo siguiente: El Comité de Cafeteros de Antioquia (efectivo): $10.000.000, Municipio (efectivo): $2.874.251, Municipio (especie): 11.467.005 y Comunidad (especie): $5.568.862, para un total de $29.910.119.

2024-07-02: El nuevo proveedor para el suministro de combustible en el convenio es la empresa DISTRICOMBUSTIBLES ANTIOQUIA S.A.S, quien el el primer despacho envió 1.089 galones de biodisel, el cual es almacenado por la secretaria de planeación en un lugar apropiado acondicionado con isotanques. Este combustible entra en custodia del Municipio para que se utilice en la ejecución de actividades propias del convenio. Por parte del Comité de Cafeteros, se sigue teniendo el acompañamiento del señor Mauricio Higuita quien es miembro activo y presta el servicio de seguimiento y control.

2024-07-10: El Municipio genero el CDP 459 para la adición presupuestal que se esta tramitando en el convenio.

2024-07-11: Desde el reinicio del convenio el 21/05/2024 y hasta la fecha se ha realizado mantenimiento a las siguientes vías: El Canelito 2.5 km, La Balsita - La Balsa 11 km, La Balsa - Moroto 3 km, San Luis del café 2 km, para un total de 18,5 km. Lo anterior, fue verificado con el jefe de maquinaria amarilla del municipio de Cañasgordas y el señor Mauricio Higuita quien es miembro del Comité Municipal.

Supervisor(a): ANDRES FELIPE URIBE MONSALVE
Este informe fue actualizado el: 2024-07-11 06:48:49

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE
Municipio(s): CAÑASGORDAS,

BIP: 3166
Convenio: CN-2022-1659
PEP: 4604120875

Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS

Otrosíes:

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2022-1659-01	INGRESO ADIC.VALOR	ESTA ADICIÓN SE HACE NECESARIA, PARA AUMENTAR EL ALCANCE DEL PROYECTO	$45.281.544	$95.523.405	2023-12-11	2024-09-21
CN-2022-1659-02	CAMBIO EN EL CLAUSULADO	ESTA ADICIÓN SE HACE NECESARIO DEBIDO A LA SOLICITUD DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS DE MODIFICAR LA FECHA DEL CDP PARA REALIZAR EL DESEMBOLSO DE LA ADICIÓN No1	$0	$140.804.949	2024-03-08	2024-09-21
CN-2022-1659-03	INGRESO ADIC.TIEMPO	DIFICULTADES EN LA ENTREGA DEL COMBUSTIBLE POR PARTE DEL PROVEEDOR, ASÍ COMO LA FUERTE TEMPORADA INVERNAL PRESENTE EN EL MUNICIPIO, LO CUAL HA GENERADO DISMINUCIÓN EN LOS RENDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES.	$0	$140.804.949	2024-05-09	2024-09-21
CN-2022-1659-04	INGRESO ADIC.VALOR Y TIEMPO	ESTA ADICIÓN SE HACE NECESARIA PARA AUMENTAR EL ALCANCE DEL PROYECTO, INTERVINIENDO LAS VÍAS TERCIARIAS DEL CORREGIMIENTO DE SAN PASCUAL.	$29.910.120	$140.804.949	2024-07-12	2024-09-21

Supervisor(a): ANDRES FELIPE URIBE MONSALVE
Este informe fue actualizado el: 2024-07-11 06:48:49

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE
Municipio(s): CAÑASGORDAS,

BIP: 3166
Convenio: CN-2022-1659
PEP: 4604120875

Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS

Anexo fotográfico:

Supervisor(a): ANDRES FELIPE URIBE MONSALVE
Este informe fue actualizado el: 2024-07-11 06:48:49
