Federación Nacional de Cafeteros de Colombia	**Federación Nacional de Cafeteros de Colombia** **Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia** **Informe de avance de proyecto**	**Código:**FE-GPA-F-0026 **Fecha:**15/02/2024 **Versión:**001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO
Municipio(s): CONCORDIA,

BIP: 3528
Convenio: CN-2023-0612
PEP: 4604120929

Objeto: MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA

Matriz de cofinanciación:

Cofinanciadores	Aporte $	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	120.801.455	39,1%
MUNICIPIO DE CONCORDIA EFECTIVO	138.000.000	44,6%
MUNICIPIO DE CONCORDIA ESPECIE	14.510.070	4,7%
COMUNIDAD EN ESPECIE	35.863.923	11,6%
Total	**309.175.448**	**100%**

Fechas de interés:

Última aprobación: 2024-08-05
Formalización: 2023-06-22
Inicio: 2023-08-22
Terminación: 2024-10-25

Entrega final: 2024-10-12

Información financiera:

Descripción	Valor $	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	**0**	**0,0%**
Facturado	218.111.498	70,5%
Ejecutado en especie	46.499.000	15,0%
Administración cobrada	11.839.685	3,8%
Subtotal ejecutado	**276.450.183**	**89,4%**
Deducciones aplicadas	11.730.000	3,8%
Subtotal	**288.180.183**	**93,2%**
Pendiente por comprometer	20.995.265	6,8%
Total	**309.175.448**	**100%**

Avance:

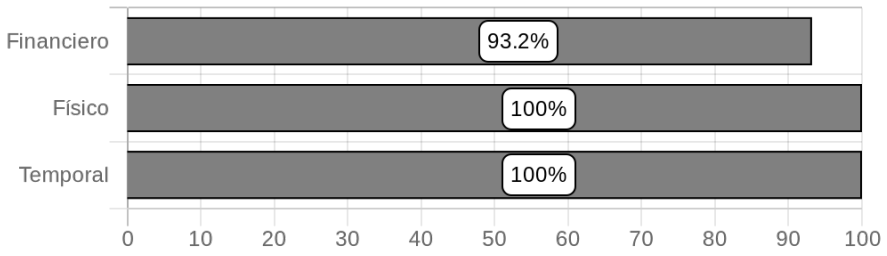

Supervisor(a): SEBASTIAN BEDOYA ARANGO
Este informe fue actualizado el: 2025-07-03 08:45:21

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO
Municipio(s): CONCORDIA,

BIP: 3528
Convenio: CN-2023-0612
PEP: 4604120929

Objeto: MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA

Observaciones:

2023-11-03: Se da inicio a las intervenciones en una vereda. No ha sido posible continuar con la ejecución debido a las condiciones climaticas que restringen la normal circulación y operación de volquetas y equipos

2023-12-21: Se realizan trabajos con maquinaria y material de afirmado en varias veredas del municipio

2024-08-08: El proyecto consideraba la intervención en 24 veredas, de las cuales en 12 se realizaron actividades durante el 2023. Conjuntamente entre Comité Municipal y Alcaldía se aprobó la intervención en 5 veredas adicionales para un total de 29, de las cuales a la fecha se han finalizado 25. La intervención en las veredas faltantes se ha encontrado sujeta a la disponibilidad de la retroexcavadora del municipio, la cual ha presentado daños y no ha prestado servicio.

2023-11-02: Se acuerda realizar las actividades de conformación y riego de material de afirmado con retroexcavadora en lugar de motoniveladora dadas las dificultades para acceder a las veredas con este equipo. De igual manera la compactación será realizada al trafico en lugar de vibrocompactador.

2024-03-15: El cargue de material de afirmado será realizado con la retroexcavadora contratada por el proyecto ante el daño del equipo de la administración municipal

2024-10-12: Se intervinieron un total de 30 vías como parte del proyecto.

Supervisor(a): SEBASTIAN BEDOYA ARANGO
Este informe fue actualizado el: 2025-07-03 08:45:21

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO
Municipio(s): CONCORDIA,

BIP: 3528
Convenio: CN-2023-0612
PEP: 4604120929

Objeto: MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA

Anexo fotográfico:

Supervisor(a): SEBASTIAN BEDOYA ARANGO
Este informe fue actualizado el: 2025-07-03 08:45:21
