| | | |
|---|---|---|
| Federación Nacional de Cafeteros de Colombia | **Federación Nacional de Cafeteros de Colombia**<br>**Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia**<br><br>**Informe de avance de proyecto** | **Código:**FE-GPA-F-0026<br>**Fecha:**15/02/2024<br>**Versión:**001 |

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO
**Municipio(s):** CAICEDO,

**BIP:** 3613
**Convenio:** CN-2023-0798
**PEP:** 4604120915

**Objeto:** MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BENEFICIO DE CAFÉ Y PARA EL MANEJO DE SUBPRODUCTOS MEDIANTE COMPOSTERAS, EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO.

**Matriz de cofinanciación:**

| Cofinanciadores | Aporte $ | % |
|---|---|---|
| COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO | 36.831.208 | 29,4% |
| MUNICIPIO DE CAICEDO EFECTIVO | 20.000.000 | 15,9% |
| COOP DE CAFICULTORES DE SALGAR EFECTIVO | 22.000.000 | 17,5% |
| EXPOCAFE S.A. EFECTIVO | 15.000.000 | 12,0% |
| COMUNIDAD EN EFECTIVO | 24.000.000 | 19,1% |
| COMUNIDAD EN ESPECIE | 7.640.073 | 6,1% |
| **Total** | **125.471.281** | **100%** |

**Fechas de interés:**

**Última aprobación:** 2023-10-02
**Formalización:** 2023-06-28
**Inicio:** 2023-07-19
**Terminación:** 2024-07-18

**Entrega final:** Pendiente

**Información financiera:**

| Descripción | Valor $ | % |
|---|---|---|
| Comprometido en solicitudes de pedido | 0 | 0,0% |
| Comprometido en pedidos | 0 | 0,0% |
| **Subtotal comprometido** | **0** | **0,0%** |
| Facturado | 103.066.861 | 82,1% |
| Ejecutado en especie | 7.639.900 | 6,1% |
| Administración cobrada | 6.763.128 | 5,4% |
| **Subtotal ejecutado** | **117.469.889** | **93,6%** |
| Deducciones aplicadas | 1.980.000 | 1,6% |
| **Subtotal** | **119.449.889** | **95,2%** |
| Pendiente por comprometer | 6.021.392 | 4,8% |
| **Total** | **125.471.281** | **100%** |

**Avance:**

**Supervisor(a):** DEICY CATALINA GUERRA GARCIA
**Este informe fue actualizado el:** 2024-05-07 07:51:49

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO
**Municipio(s):** CAICEDO,

**BIP:** 3613
**Convenio:** CN-2023-0798
**PEP:** 4604120915

**Objeto:** MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BENEFICIO DE CAFÉ Y PARA EL MANEJO DE SUBPRODUCTOS MEDIANTE COMPOSTERAS, EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO.

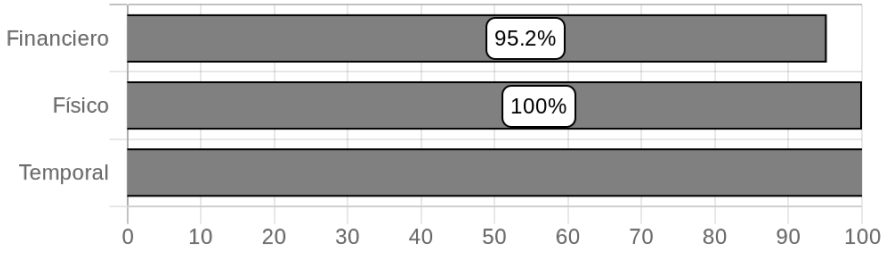


**Supervisor(a):** DEICY CATALINA GUERRA GARCIA
**Este informe fue actualizado el:** 2024-05-07 07:51:49

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO
**Municipio(s):** CAICEDO,

**BIP:** 3613
**Convenio:** CN-2023-0798
**PEP:** 4604120915

**Objeto:** MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BENEFICIO DE CAFÉ Y PARA EL MANEJO DE SUBPRODUCTOS MEDIANTE COMPOSTERAS, EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO.

**Observaciones:**

**2024-08-06:** Se instalaron 10 composteras y 20 marquesinas. Se encuentra cerrado

**Supervisor(a):** DEICY CATALINA GUERRA GARCIA
**Este informe fue actualizado el:** 2024-05-07 07:51:49

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO
**Municipio(s):** CAICEDO,

**BIP:** 3613
**Convenio:** CN-2023-0798
**PEP:** 4604120915

**Objeto:** MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BENEFICIO DE CAFÉ Y PARA EL MANEJO DE SUBPRODUCTOS MEDIANTE COMPOSTERAS, EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO.

**Anexo fotográfico:**

**Supervisor(a):** DEICY CATALINA GUERRA GARCIA
**Este informe fue actualizado el:** 2024-05-07 07:51:49
