Federación Nacional de Cafeteros de Colombia	**Federación Nacional de Cafeteros de Colombia** **Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia** **Informe de avance de proyecto**	**Código:**FE-GPA-F-0026 **Fecha:**15/02/2024 **Versión:**001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO
Municipio(s): ANDES,

BIP: 4145
Convenio:
EJEC.DIRECTA
PEP: 3604120011

Objeto: MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA GRUPO ASOCIATIVO RENACER SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE ANDES

Matriz de cofinanciación:

Cofinanciadores	Aporte $	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	19.412.477	100,0%
Total	**19.412.477**	**100%**

Fechas de interés:
Última aprobación: 2024-07-02
Formalización: NO APLICA
Inicio: 2024-07-02
Terminación: 2024-12-02

Entrega final: 2024-11-29

Información financiera:

Descripción	Valor $	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	**0**	**0,0%**
Facturado	17.635.465	90,8%
Ejecutado en especie	0	0,0%
Administración cobrada	0	0,0%
Subtotal ejecutado	**17.635.465**	**90,8%**
Deducciones aplicadas	0	0,0%
Subtotal	**17.635.465**	**90,8%**
Pendiente por comprometer	1.777.012	9,2%
Total	**19.412.477**	**100%**

Avance:

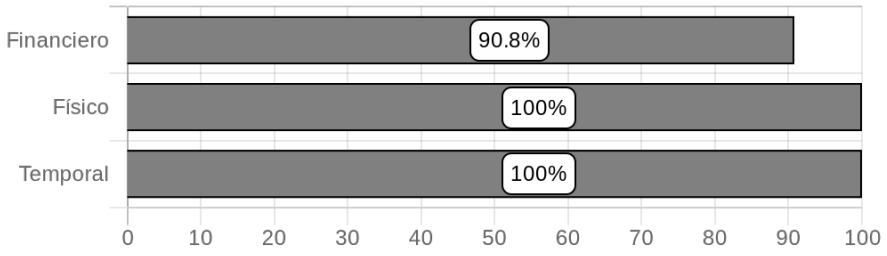

Supervisor(a): KAROL DAYAN ORDOÑEZ FRANCO
Este informe fue actualizado el: 2025-03-18 11:02:31

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO
Municipio(s): ANDES,

BIP: 4145
Convenio:
EJEC.DIRECTA
PEP: 3604120011

Objeto: MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA GRUPO ASOCIATIVO RENACER SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE ANDES

Observaciones:

2024-11-29: Se ha realizado la totalidad de las adecuaciones

Supervisor(a): KAROL DAYAN ORDOÑEZ FRANCO
Este informe fue actualizado el: 2025-03-18 11:02:31
