Federación Nacional de Cafeteros de Colombia	**Federación Nacional de Cafeteros de Colombia** **Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia** **Informe de avance de proyecto**	**Código:**FE-GPA-F-0026 **Fecha:**15/02/2024 **Versión:**001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO
Municipio(s): ANDES,

BIP: 2070
Convenio: CN-2021-0641
PEP: 4604120734

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DEL CORREGIMIENTO SANTA RITA Y DE LA VEREDA LA MESETA, EN EL MUNICIPIO DE ANDES

Matriz de cofinanciación:

Cofinanciadores	Aporte $	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	679.916.109	27,8%
MUNICIPIO DE ANDES EFECTIVO	1.470.911.030	60,1%
COMUNIDAD EN ESPECIE	297.283.842	12,1%
Total	**2.448.110.981**	**100%**

Fechas de interés:

Última aprobación: 2023-04-24
Formalización: 2021-06-11
Inicio: 2021-07-22
Terminación: 2024-09-04

Entrega final: 2024-04-22

Información financiera:

Descripción	Valor $	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	**0**	**0,0%**
Facturado	1.922.948.779	78,5%
Ejecutado en especie	297.277.000	12,1%
Administración cobrada	154.031.339	6,3%
Subtotal ejecutado	**2.374.257.118**	**97,0%**
Deducciones aplicadas	73.545.552	3,0%
Subtotal	**2.447.802.670**	**100,0%**
Pendiente por comprometer	308.311	0,0%
Total	**2.448.110.981**	**100%**

Avance:

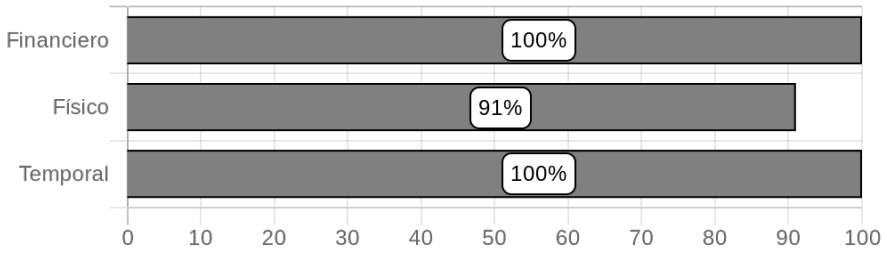

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA
Este informe fue actualizado el: 2024-04-22 08:55:12

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO
Municipio(s): ANDES,

BIP: 2070
Convenio: CN-2021-0641
PEP: 4604120734

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DEL CORREGIMIENTO SANTA RITA Y DE LA VEREDA LA MESETA, EN EL MUNICIPIO DE ANDES

Observaciones:

2023-07-23: En el acueducto de la vereda La Meseta se tiene construida la bocatoma, la instalación del tanque desarenador, la cámara reguladora de caudales, las redes de conducción, distribución, tanques de quiebre, las válvulas ventosas y de cierre, la losa de los tanques de almacenamiento con sus respectivos tanques en fibra de vidrio y la instalación de 127 domiciliarias.

2024-02-27: A la fecha se viene adelantando la apertura de brechas e instalación de la tubería, la losa en concreto para la instalación de los tanques de almacenamiento en fibra de vidrio, al igual que los medidores de agua en el casco urbano de Santa Rita y se tiene previsto la instalación de la planta de tratamiento de agua potable para el mes de marzo.

2024-04-22: A la fecha se viene adelantando la instalación de los medidores en el casco urbano del corregimiento, ya la comunidad en un convite subieron los 2 tanque de almacenamiento de 20 m3, donde la comunidad dispuso para su instalación, de igual forma se viene adelantado la construcción de la PTAP para posteriormente dar la capacitación al personal operador y la junta administradora.

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA
Este informe fue actualizado el: 2024-04-22 08:55:12

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO
Municipio(s): ANDES,

BIP: 2070
Convenio: CN-2021-0641
PEP: 4604120734

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DEL CORREGIMIENTO SANTA RITA Y DE LA VEREDA LA MESETA, EN EL MUNICIPIO DE ANDES

Anexo fotográfico:

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA
Este informe fue actualizado el: 2024-04-22 08:55:12
